

***EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.***

**SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO
CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES**

**PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA:
PMA“RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL
RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO”.**



**INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION DEL COMPONENTE DE
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA OBRA: “R.M.V. IGLESIA
BELEN DE ACOMAYO”**

RESPONSABLE:

LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

**RNA. N° BC -1183
COARPE N° 040810**

CUSCO – 2015

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

1

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

INFORME ANUAL Y PRE LIQUIDACION 2014
**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA:PMA “RECUPERACION
DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO”.**

01.00 INTRODUCCION

02.00 DATOS GENERALES DE LA OBRA

02.01 RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

02.02 NOMBRE DEL PROYECTO

02.03 NOMBRE DE LA META

02.04 LOCALIZACION

02.05 UBICACIÓN

02.06 CUADRO GENERAL DE AREAS

02.07 AREA TOTAL DEL PREDIO

02.07.01. AREA TOTAL CONSTRIDA

02.07.02. AREA LIBRE DEL PREDIO

02.07.03. AREA PROGRAMADA INTERVENIDA

02.07.04. AREA DE METAS AMPLIADAS

02.07.05. AREA EJECUTADA TOTAL

02.08 AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO ANTERIOR

02.09 AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO DEL AÑO

02.10 METRADO ACUMULADO ANTERIOR

02.11 METRADO EJECUTADO DEL AÑO

02.12 FECHA DE INICIO EN EL AÑO

02.13 FECHA DE CONCLUSION DEL AÑO

02.14 PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

02.15 PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO

02.16 PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO

02.17 PRESUPUESTOS EJECUTADOS POR CADA AÑO DE
INTERVENCION ANTERIOR

02.18 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

03.00 EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DE OBRA DEL AÑO

04.00 VALORIZACION FINAL

04.01 COSTO DIRECTO

04.02 COSTO DIRECTO DE LAS PARTIDAS

04.03 IMPREVISTOS

04.04 TOTAL COSTO DIRECTO

04.05 GASTOS GENERALES

04.06 TOTAL GASTOS GENERALES

04.07 TOTAL VALORIZACION

- SALDO DE EXISTENCIA FISICA DE MATERIALES VALORIZADO.
- EXTRACTOS MENSUALES DE LOS PARTES DE ALMACEN DEL AÑO
- PARTES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OBRA MENSUALES DEL AÑO
- TODAS LAS VALORIZACIONES MENSUALES DE AÑO.



**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

- 05.00 ANTECEDENTES HISTORICOS**
- 06.00 ANALISIS ARQUITECTONICO**
- 07.00 ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL**
- 08.00 CAUSAS DE DETERIORO**
- 09.00 INTERVENCIONES ANTERIORES**
- 10.00 OBJETIVOS**
- 11.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS**
- 12.00 EJECUCION DE PROGRAMACION GENERAL DE OBRA, REFERIDA A LA
PROGRAMACION APROBADA (CUADROS)**
- 13.00 PLANOS**
- 14.00 FOTOGRAFIAS**
- 15.00 OTROS DOCUMENTOS:**

**ANEXOS
INFORMES DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA**

01.00 INTRODUCCIÓN

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

El expediente de pre-liquidación es desarrollado en virtud a las normativas vigentes como la Directiva 004-2007-INC-DRC-C “Normas para la ejecución de Obras en la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco” (Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación) y acorde a los términos de referencia del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S. N° 004-2000-ED) y su modificatoria.

El presente año 2014 se cuenta con un monto presupuestal de 123,819.00 nuevos soles para la realizar las labores del Componente de Investigación Arqueologica de la Obra Recuperación del Monumento Virreynal Religioso Iglesia Belen de Acomayo.

Es así que la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a través del Área Funcional de Obras, tuvo previsto como propuesta funcional y arquitectónica, mejorar y culminar con los trabajos de Restauración del Monumento Virreynal Religioso Iglesia Belen de Acomayo-Cusco, para lo cual se tuvo Programado la Ejecución del Expediente que tuvieron como objetivo conservar los valores estéticos e históricos del monumento.

El presente informe está referido al Componente de Investigación arqueológica, dentro del cual se tuvo como finalidad evitar la destrucción, deterioro y pérdida de evidencias culturales que se pudieron encontrar durante la Investigación Arqueologica, donde se ejecutaron partidas programadas así como también se adicionaron partidas, como también se deducieron a causa que no se contaba con monto presupuestal en el rubro de Gastos Generales ya que se tubo un desfase presupuestal por la demora en la obtención de la resolución directoral (autorización para iniciar con los trabajos del componente de Investigación Arqueologica) por un periodo de 06 meses por lo que no se podía ejecutar partidas del componente de Investigación Arqueologica. (Apertura de unidades de Excavación).

Mediante el presente se realiza el informe de pre liquidación e informe final de las partidas ejecutadas en el Componente de Investigación Arqueologica así como se da a conocer el consolidado de reportes financieros afectados a la meta 0105.

Los trabajos de Investigación Arqueologica esta relacionado al uso de métodos y técnicas de rigor científico y así queden registrados de modo permanente y seguro para el uso y conocimiento de nuevas generaciones.

Así también cabe mencionar que se obtuvo una autorización de la DDC- Cusco como Proyecto de Investigación Arqueologica: Plan de Monitoreo Arqueologico y como por el reglamento de Investigación Arqueologica el PMAes hasta la culminación de remoción de suelos en Obra es por ello que la responsable del CIA permanecio monitoreando los trabajos hasta el mes de Diciembre, y se deja este mes porque ya no se cuenta con presupuesto necesario para tal fin, dejándose áreas aun por monitorear en vista que se continuara realizando remoción de suelos en el sector B de la Iglesia, por lo que se debería continuar monitoreando de acuerdo al RIA.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

02.00 DATOS GENERALES DE LA OBRA

02. 01.- Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.

Resolucion Directoral No.045 DDC – Cusco.

02.01.01.- Resolución de aprobación de expediente de Investigación Arqueologica.

Resolucion Directoral No. 184 DDC-CUS/MC del 31 de Marzo 2014.(autorización o permiso para realizar labores del Componente de Investigacion).

02. 02.- Nombre del Proyecto.

“RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO”

02.03.- Nombre de la Meta:

Meta: 0105. “RMVR iglesia Belen de Acomayo”

02.04.- LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.

Departamento : CUSCO
Provincia : CUSCO
Distrito : ACOMAYO



IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

UBICACIÓN.

Ubicación Geográfica de la Provincia de Acomayo

	RANGO COORDENADAS ALTITUDINAL			SUPERFICIE (Km ²)
	LATITUD SUR	LONGITUD OESTE	ALTITUD (m.s.n.m.)	
ACOMAYO	13°54'51"	71°40'52"	3,189 msnm	141,27

COORDENADAS DE U.T.M (SISTEMA WGS – 84)			
	Coordenada Norte	Abscisa Este	Altitud
Zona 19	8 459245	210329	3,189m.s.n.m

2.5 CUADRO GENERAL DE AREAS.

	Area (M2)
Área total del predio	658.242 m2
Area Total Construida	338.525 m2
Area Libre del Predio	319.717 m2
Area Programada Intervenida	59.89 m3
Area de Metas Ampliadas	0.00
Area Ejecutada Total	59.89 m3

02.06.- Avance físico Porcentual Acumulado Anterior

9.97%

02.07.- Avance físico Porcentual Ejecutado del Año.

99.61%.

02.08.- Metrado Acumulado Anterior

6.98m3.

02.09.- Metrado Ejecutado del Año.

59.89 m3.

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

02.10.- Metrado acumulado total.

66.87 m3.

02.11- Fecha de Inicio en el Año.

15 de Enero del 2014. (Personal Profesional Arqueologo).

**07 de Abril del 2014. (Personal Profesional asistente en Arqueologia y
02 personal obrero)**

02.12.- Fecha de Conclusión del año.

31 de Diciembre del 2014.

02.13.- Presupuesto Total de la Obra

S/. 144,166.24

02.14.- Presupuesto Asignado en el Año.

S/. 123,819.00 Nuevos Soles.

02.15.- Presupuesto Ejecutado en el Año.

S/. 105,248.96 Nuevos Soles.

02.16.- presupuesto ejecutados por cada año de intervención anterior.

Año 2013

S/. 20,353.17.

EJECUCION FINANCIERA 2013	
S/. 7059.2	OCTUBRE
S/. 5552.98	NOVIEMBRE
S/. 7740.93	DICIEMBRE
S/. 20353.11	TOTAL

Año 2014

S/. 105,248.96.

02.17.- Fuente de financiamiento.

Recursos Directamente Recaudados.

03.00.- EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DE OBRA DEL AÑO

- Correspondientes a los meses de duración de obra, ejecución presupuestal corresponde al monto consignado en los reportes de afectación presupuestal por diferentes conceptos, según el reporte de la oficina de planificación y presupuesto para obras por inversión el mismo que asciende a la suma de:

S/. 105,248.96 nuevos soles.

(Ciento cinco mil docientos cuarenta y ocho con 96/100 nuevos soles).

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

No.	META	EJECUCION PRESUPUESTAL	MONTO
1	META 105	MES DE ENERO	4,704.82
2		MES DE FEBRERO	5,059.46
3		MES DE MARZO	5,059.46
4		MES DE ABRIL	9,782.48
5		MES DE MAYO	12,566.23
6		MES DE JUNIO	12,672.76
7		MES DE JULIO	14,599.61
8		MES DE AGOSTO	9,138.91
9		MES DE SETIEMBRE	12,583.91
10		MES DE OCTUBRE	8,315.00
11		MES DE NOVIEMBRE	5,040.17
12		MES DE DICIEMBRE	5,655.79
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO			105,248.96

04.00.- VALORIZACION FINAL

04.01.- COSTO DIRECTO

Costo Directo de las Partidas	S/.114,194.56.
Imprevistos	S/. 5,142.67
TOTAL COSTO DIRECTO	S/.119,337.23

04.02.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	
REMUNERACION DEL RESIDENTE	0.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0.00
GRATIFICACIONES Y AGUINALDOS(fiestas patrias)	1,997.21
PLANILLA VACACIONES INVERSION 2013	0.00
ESCOLARIDAD	400.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	111.10
MATERIALES DE ESCRITORIOS Y OTROS	114.10
ALQUILER DE EQUIPO	0.00
REPUESTOS	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO	0.00
MEDICAMENTOS	0.00
VESTUARIO	1379.01
ENSERES	0.00
PASAJES	0.00
TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00
SERVICIOS DE TERCEROS	0.00
COSTO DE PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	0.00
COSTO DE SUPERVISION	00.0

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

OTROS	
TOTAL GASTOS GENERALES.	4,001.42

04.03.- TOTAL VALORIZACION = S/. 123,338.65.

- **SALDO DE EXISTENCIA FISICA DE MATERIALES VALORIZADO. (SE ADJUNTA)**
- **EXTRACTOS MENSUALES DE LOS PARTES DE ALMACEN DEL AÑO (SE ADJUNTA)**
- **PARTES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OBRA MENSUALES DEL AÑO (SE ADJUNTA).**

MATERIALES EN CANCHA:

El material que a la fecha se encuentra en el Almacen de la obra. (sin uso alguno).

MATERIALES EN CANCHA	
VESTUARIO	315.02
MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	626.20
MATERIALES DE ESCRITORIO	468.80
OTROS(Herramientas de costo directo)	468.80
TOTAL EN MATERIALES	1,718.52

MATERIALES EN CANCHA

CANT	VESTUARIO	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
01	botas de jebe caña alta	pares	30.00	30.00
01	cascos tipo jokey color azul	pieza	27.02	27.02
01	conjunto camisa pantalon pesado	conjunto	112.00	112.00
01	poncho impermeable para lluvia	unidad	20.00	20.00
01	protector de oidos	unidad	13.00	13.00
01	zapatos caña alta punta de acero	pares	113.00	113.00
	TOTAL			315.02

CANT.	MATERIAL DE LIMPIEZA y OTROS	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
10	cepillo dental adultos	unidad	1.8	18.00
	desinfectante en gel			
01	antibacterial	frasco	5.5	5.50
4	dispensador de jabon liquido	unidad	39.8	159.20
01	escoba de plastico ovalada	unidad	10.5	10.50
	escobilla de plastico para lavar			
01	ropa	unidad	4.5	4.50
1	escobillon de cerda de 50 ma	unidad	15.5	15.50
2	bidon de plastico x 20gln	unidad	50	100.00

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.

01	bolsas plasticas gruesas	paquetes	14	14.00
1	plastico doble ancho grueso	rollo	290	290.00
1	recogedor plastico	Unidad	9	9.00
				626.20

CANT.	MATERIAL DE ESCRITORIO	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	calculadora BP5420-D	unidad	28.00	28.00
01	grapap 26/6x500	caja	3.80	3.80
1	Papel bond ploter de 0.91grx40m. papel canson de	rollo	42.00	42.00
1	120grx20mts pizarra acrilica de 1.50 por	rollo	149.00	149.00
1	1.10	unidad	220.00	220.00
1	sello fechador automatico 4810	unidad	26.00	26.00
TOTAL				468.80

MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO .- que se deja también en el almacen de obra.

CANT.	MATERIAL HERRAMIENTA DE TRABAJO	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
02	Brocha pelo de nylon de 6"	unidad	31.00	62.00
03	Badilejos reforzado con mango de madera	unidad	10.00	30.00
02	Clavo C/C 8" para madera calibre	kilogramo	8.00	16.00
01	Cordel No. 16	kilogramo	29.00	29.00
01	Nivel aéreo de aluminio	unidad	12.00	12.00
02	Pala p/excavación arqueologica	unidad	23.00	46.00
02	Picos de punta con mango	unidad	32.00	64.00
03	Wincha de 5 metros metalica	unidad	16.50	49.50
				308.50

Total : 1,718.52

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

10



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Todas las Valorizaciones Mensuales del Año



Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

RESPONSABLE: LIC. ARQ. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

MINISTERIO DE CULTURA	
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO	
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.	
Muebles e Inmuebles	
FOLIO Nº	

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105

CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE ENERO FEBRERO 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014						VALORIZAC. ANTERIOR		%	VALORIZAC. ACTUAL		%	VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR		
PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	ANTERIOR	METRADO	PARCIAL	ACTUAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21											842.21	
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	BID	150.00	5.28	792.00	-	-		-	-		-	-		150.00	792.00	100.00%
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	-	-		-	-		-	-		17.02	50.21	100.00%
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58											1,350.58	
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	-	-		-	-		-	-		60.00	1,197.60	100.00%
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFICADO	M3	0.30	119.50	35.85	-	-		-	-		-	-		0.30	35.85	100.00%
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	-	-		-	-		-	-		17.00	117.13	100.00%
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10											2,795.10	
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	-	-		-	-		-	-		70.00	2,051.70	100.00%
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	-	-		-	-		-	-		90.00	743.40	100.00%
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47											32,212.47	
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	-	-		-	-		-	-		70.00	32,130.00	100.00%
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boogues a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	-	-		-	-		-	-		3.00	82.47	100.00%
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66											5,833.66	
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	-	-		-	-		-	-		44.43	5,833.66	100.00%
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16											35,557.16	
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	-	-		-	-		-	-		561.00	11,814.66	100.00%
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	-	-		-	-		-	-		50.00	1,398.50	100.00%
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-		-	-		-	-		50.00	869.00	100.00%
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-		-	-	0.00%	-	-		50.00	1,475.00	100.00%
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-		-	-		-	-		1.00	20,000.00	100.00%
09.00.00	DATACION				334.93											334.93	
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-		-	-	0.00%	-	-		0.07	50.09	93.31%
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-		-	-	0.00%	-	-		0.01	281.25	100.00%
10.00.00	VIARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33											169.33	
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-		-	-		-	-		93.04	169.33	100.00%
DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.		MES	7.00	5,059.46	35,416.22	0.85	4,304.82		1.00	5,059.46		1.85	9,364.28	26.44	5.15	26,051.94	73.56%
COSTO DIRECTO					114,511.66		4,304.82			5,059.46			9,364.28	8.18		105,143.79	91.82
IMPREVISTO (1.48%)					5,766.65		0.00			0.00			0.00			5,766.65	48.65%
TOTAL COSTO DIRECTO					120,278.31		4,304.82			5,059.46			9,364.28			110,910.44	100.00%
GASTOS GENERALES					3,540.70		400.00			0.00			400.00			0.00	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO					123,819.01		4,704.82	3.80	4.09	5,059.46	4.09		9,764.28	7.89		114,054.74	92.11

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo	-	-
5.11	Obligaciones del empleador	-	-
5.18	Bienes (vestuario)	-	-
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	-	-
5.21	aguinaldos fiestas patrias	-	-
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	-	-
TOTAL		400.00	400.00

NOTA.

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que el expediente tecnico no consideraba el sueldo de la responsable para los 07 meses de ejecucion del proyecto. asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros. asi mismo el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE MARZO 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014																
PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	VALORIZAC. ANTERIOR		VALORIZAC. ACTUAL		VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR			
						METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES															
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21										842.21	
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	BID	150.00	5.28	792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	792.00	100.00%
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	-	-	-	-	-	-	-	-	17.02	50.21	100.00%
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58										1,350.58	
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	1,197.60	100.00%
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFICADO	M3	0.30	119.50	35.85	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	35.85	100.00%
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00	117.13	100.00%
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10										2,795.10	
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	2,051.70	100.00%
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	743.40	100.00%
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47										32,212.47	
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	32,130.00	100.00%
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en booguis a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	82.47	100.00%
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66										5,833.66	
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	-	-	-	-	-	-	-	-	44.43	5,833.66	100.00%
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16										35,557.16	
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	-	-	-	-	-	-	-	-	561.00	11,814.66	100.00%
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	1,398.50	100.00%
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	869.00	100.00%
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	50.00	1,475.00	100.00%
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	20,000.00	100.00%
09.00.00	DATACION				334.93										334.93	
09.00.04	ANALISIS OSTEOLOGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.07	766.90	1428.57%
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION AR	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%
10.00.00	VIARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33										169.33	
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-	-	-	-	-	-	-	93.04	169.33	100.00%
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	1.85	9,364.28	1.00	5,059.46	2.85	14,423.74	40.73	4.15	20,992.48	59.27%	
	COSTO DIRECTO				114,511.66		9,364.28		5,059.46		14,423.74	12.60		79,808.66	87.40	
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00		0.00		0.00			5,766.65	48.65%	
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		9,364.28		5,059.46		14,423.74			85,575.31	100.00%	
	GASTOS GENERALES				3,540.70		400.00		0.00		400.00			0.00	0.00%	
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		9,764.28	7.89	5,059.46	4.09	14,823.74	11.97		108,995.28	88.03	

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo	-	-
5.11	Obligaciones del empleador	-	-
5.18	Bienes (vestuario)	-	-
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	-	-
5.21	aguinaldos fiestas patrias	-	-
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	-	-
	TOTAL	400.00	400.00

NOTA:

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que el expediente tecnico no consideraba el sueldo de la responsable para los 07 meses de ejecucion del proyecto. asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros.

asi mismo el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE ABRIL 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014				VALORIZAC. ANTERIOR			VALORIZAC. ACTUAL			VALORIZAC. ACUMULADA				SALDO A VALORIZAR		
			METRADO	PRECIO	PARCIAL		METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	%	METRADO	PARCIAL	%
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																		
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21													842.21	
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA (A)	BID	150.00	5.28	792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	792.00	100.00%	
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.02	50.21	100.00%	
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58													1,170.94	
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	-	-	-	9.00	179.64		9.00	179.64		15.00	51.00	1,017.96	85.00%	
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFICADO	M3	0.30	119.50	35.85	-	-	-	-	-		-	-		-	0.30	35.85	100.00%	
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	-	-	-	-	-		-	-		-	17.00	117.13	100.00%	
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10													2,795.10	100.00%
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	-	-	-	-	-		-	-		-	70.00	2,051.70	100.00%	
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	-	-	-	-	-		-	-		-	90.00	743.40	100.00%	
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47													26,107.82	81.05%
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	-	-	-	13.24	6,077.16		13.24	6,077.16		18.91	56.76	26,052.84	81.09%	
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boquetes a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	-	-	-	1.00	27.49		1.00	27.49		33.33	2.00	54.98	66.67%	
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66													5,833.66	
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	-	-	-	-	-		-	-		-	44.43	5,833.66	100.00%	
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16													34,656.63	
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	-	-	-	42.76	900.53		42.76	900.53		7.62	518.24	10,914.13	92.38%	
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	-	-	-	-	-		-	-		-	50.00	1,398.50	100.00%	
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-	-	-	-		-	-		-	50.00	869.00	100.00%	
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-	-	-	-		-	-		0.00%	50.00	1,475.00	100.00%	
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-		-	-		-	1.00	20,000.00	100.00%	
09.00.00	DATAION				334.93													1,048.15	
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-	-	-	-		-	-		0.00%	0.07	766.90	1428.57%	
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ARQ	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-	-	-	-		-	-		0.00%	0.01	281.25	100.00%	
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33													169.33	
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-	-	-	-		-	-		-	93.04	169.33	100.00%	
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	2.85	14,423.74		1.00	5,059.46		3.85	19,483.20		55.01	3.15	15,933.02	44.99%	
	COSTO DIRECTO				114,511.66		14,423.74			12,244.28			26,668.01		23.29		72,623.85	76.71	
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00			0.00			0.00				5,766.65	48.65%	
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		14,423.74			12,244.28			26,668.01				78,390.50	100.00%	
	GASTOS GENERALES				3,540.70		400.00			0.00			400.00				0.00	0.00%	
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		14,823.74	11.97		12,244.28	9.89		27,068.01	21.86			96,751.00	78.14	

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo	-	-
5.11	Obligaciones del empleador	-	-
5.18	Bienes (vestuario)	-	-
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	-	-
5.21	aguinaldos fiestas patrias	-	-
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	-	-
	TOTAL	400.00	400.00

NOTA.

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que el expediente tecnico no consideraba el sueldo de la responsable para los 07 meses de ejecucion del proyecto. asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros. asi mismo el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE MAYO 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	VALORIZAC. ANTERIOR			VALORIZAC. ACTUAL			VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR			
						METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																	
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21													827.46
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQU	BID	150.00	5.28	792.00	-	-		-	-		-	-		150.00	792.00	100.00%	
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	-	-		5.00	14.75		5.00	14.75	29.38	12.02	35.46	70.62%	
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58													886.99
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	9.00	179.64		12.50	249.50		21.50	429.14	35.83	38.50	768.46	64.17%	
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFI	M3	0.30	119.50	35.85	-	-		-	-		-	-		0.30	35.85	100.00%	
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	-	-		5.00	34.45		5.00	34.45	29.41	12.00	82.68	70.59%	
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10													2,795.10
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	-	-		-	-		-	-		70.00	2,051.70	100.00%	
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	-	-		-	-		-	-		90.00	743.40	100.00%	
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47													17,405.28
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICO	M3	70.00	459.00	32,130.00	13.24	6,077.16		18.84	8,647.56		32.08	14,724.72	45.83	37.92	17,405.28	54.17%	
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boogües a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	1.00	27.49		2.00	54.98		3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00%	
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66													5,833.66
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	-	-		-	-		-	-		44.43	5,833.66	100.00%	
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16													33,035.01
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	42.76	900.53		77.00	1,621.62		119.76	2,522.15	21.35	441.24	9,292.51	78.65%	
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	-	-		-	-		-	-		50.00	1,398.50	100.00%	
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-		-	-		-	-		50.00	869.00	100.00%	
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-		-	-		-	-	0.00%	50.00	1,475.00	100.00%	
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-		-	-		-	-		1.00	20,000.00	100.00%	
09.00.00	DATACION				334.93													1,048.15
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-		-	-		-	-	0.00%	0.07	766.90	1428.57%	
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIC	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-		-	-		-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%	
10.00.00	VIARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33													169.33
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-		-	-		-	-		93.04	169.33	100.00%	
11.00.00	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	3.85	19,483.20		1.00	5,059.46		4.85	24,542.66	69.30	2.15	10,873.56	30.70%	
	COSTO DIRECTO				114,511.66		26,668.01			15,682.32			42,350.33	36.98		62,000.99	63.02	
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00			0.00			0.00			5,766.65	48.65%	
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		26,668.01			15,682.32			42,350.33			67,767.64	100.00%	
	GASTOS GENERALES				3,540.70		400.00			1,033.21			1,433.21			0.00	0.00%	
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		27,068.01	21.86		16,715.53	13.50		43,783.54	35.36		80,035.47	64.64	

GASTOS GENERALES

	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1 Retribuciones y Complementos a plazo fijo			-
5.11 Obligaciones del empleador			-
5.18 Bienes (vestuario)	-	905.01	905.01
5.19 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	-	400.00
5.2 Limpieza	-	46.70	46.70
5.21 aguinaldos fiestas patrias	-	-	-
5.45 Medicamentos	-	-	-
5.49 Materiales de escritorio	-	81.50	81.50
TOTAL	400.00	1,033.21	1,433.21

nota:

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros. asi mismo el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE JUNIO 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PARTIDAS	PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014				VALORIZAC. ANTERIOR			%	VALORIZAC. ACTUAL			%	VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR		
	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL		METRADO	PARCIAL	METRADO		PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																	
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21													812.71
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUEOL	BID	150.00	5.28	792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	792.00	100.00%	
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	5.00	14.75	5.00	14.75	10.00	29.50	58.75	7.02	20.71	41.25%			
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58													667.43
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	21.50	429.14	11.00	219.56	32.50	648.70	54.17	27.50	548.90	45.83%			
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFICADO	M3	0.30	119.50	35.85	-	-	-	-	-	-	-	0.30	35.85	100.00%			
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	5.00	34.45	-	-	5.00	34.45	29.41	12.00	82.68	70.59%			
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10													2,795.10
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	2,051.70	100.00%	
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	743.40	100.00%	
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47													10,336.68
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	32.08	14,724.72	15.40	7,068.60	47.48	21,793.32	67.83	22.52	10,336.68	32.17%			
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boquetes a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	3.00	82.47	-	-	3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00%			
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66													4,192.41
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	-	-	12.50	1,641.25	12.50	1,641.25	28.13	31.93	4,192.41	71.87%			
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16													31,444.13
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	119.76	2,522.15	68.90	1,451.03	188.66	3,973.18	33.63	372.34	7,841.48	66.37%			
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	-	-	5.00	139.85	5.00	139.85	10.00	45.00	1,258.65	90.00%			
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	869.00	100.00%			
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	50.00	1,475.00	100.00%			
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	20,000.00	100.00%			
09.00.00	DATACION				334.93													1,048.15
09.00.04	ANALISIS OSTEOLOGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.07	766.90	1428.57%			
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%			
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33													169.33
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.04	169.33	100.00%	
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	4.85	24,542.66	1.00	5,059.46	5.85	29,602.12	83.58	1.15	5,814.10	16.42%			
	COSTO DIRECTO				114,511.66		42,350.33		15,594.50		57,944.84	50.60		51,465.94	49.40			
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00		0.00		0.00			5,766.65	48.65%			
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		42,350.33		15,594.50		57,944.84			57,232.59	100.00%			
	GASTOS GENERALES				3,540.70		1,433.21		415.50		1,848.71			0.00	0.00%			
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		43,783.54	35.36	16,010.00	12.93	59,793.55	48.29		64,025.47	51.71			

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1 Retribuciones y Complementos a plazo fijo			-
5.11 Obligaciones del empleador			-
5.18 Bienes (vestuario)	905.01	376.00	1,281.01
5.19 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	-	400.00
5.2 Limpieza	46.70	39.50	86.20
5.21 aguinaldos fiestas patrias	-	-	-
5.45 Medicamentos	-	-	-
5.49 Materiales de escritorio	81.50	-	81.50
TOTAL	1,433.21	415.50	1,848.71

nota:

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros.

asi mismo el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE JULIO 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PARTIDAS	PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014					VALORIZAC. ANTERIOR		VALORIZAC. ACTUAL		VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR		
	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES														
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21									691.27	
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQU	BID	150.00	5.28	792.00	-	-	23.00	121.44	23.00	121.44	15.33	127.00	670.56	84.67%
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	10.00	29.50			10.00	29.50	58.75	7.02	20.71	41.25%
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58									349.03	
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	32.50	648.70	12.50	249.50	45.00	898.20	75.00	15.00	299.40	25.00%
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFI	M3	0.30	119.50	35.85	-	-	-	-	-	-	-	0.30	35.85	100.00%
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	5.00	34.45	10.00	68.90	15.00	103.35	88.24	2.00	13.78	11.76%
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10									1,540.10	55.10%
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	-	-	40.00	1,172.40	40.00	1,172.40	57.14	30.00	879.30	42.86%
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	-	-	10.00	82.60	10.00	82.60	11.11	80.00	660.80	88.89%
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47									2,694.33	8.36%
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICO	M3	70.00	459.00	32,130.00	47.48	21,793.32	16.65	7,642.35	64.13	29,435.67	91.61	5.87	2,694.33	8.39%
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boogules a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	3.00	82.47			3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00%
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66									2,058.78	35.29%
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	12.50	1,641.25	16.25	2,133.63	28.75	3,774.88	64.71	15.68	2,058.78	35.29%
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16									24,026.90	
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	188.66	3,973.18	85.56	1,801.89	274.22	5,775.07	48.88	286.78	6,039.59	51.12%
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	5.00	139.85	22.00	615.34	27.00	755.19	54.00	23.00	643.31	46.00%
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	869.00	100.00%
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	50.00	1,475.00	100.00%
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	0.25	5,000.00	0.25	5,000.00	25.00	0.75	15,000.00	75.00%
09.00.00	DATACION				334.93									1,048.15	
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.07	766.90	1428.57%
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIG	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33									169.33	
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-	-	-	-	-	-	93.04	169.33	100.00%
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	5.85	29,602.12	0.01	59.46	5.86	29,661.58	83.75	1.14	5,754.64	16.25%
	COSTO DIRECTO				114,511.66		57,944.84		18,947.51		76,892.35	67.15		32,577.89	32.85
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00		0.00		5,766.65			5,766.65	48.65%
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		57,944.84		18,947.51		76,892.35			38,344.54	100.00%
	GASTOS GENERALES				3,540.70		1,848.71		2,152.71		4,001.42			0.00	0.00%
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		59,793.55	48.29	21,100.22	17.04	80,893.77	65.33		42,925.25	34.67

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo		-
5.11	Obligaciones del empleador		-
5.18	Bienes (vestuario)	1,281.01	98.00
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	-
5.2	Limpieza	86.20	24.90
5.21	aguinaldos fiestas patrias	-	1,997.21
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	81.50	32.60
	TOTAL	1,848.71	2,152.71

NOTA:

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que el expediente tecnico no consideraba el sueldo de la responsable para los 07 meses de ejecucion del proyecto. asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros.

asi mismo el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE AGOSTO 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PARTIDAS	PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014					VALORIZAC. ANTERIOR			VALORIZAC. ACTUAL			VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR		
	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21												
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	BID	150.00	5.28	792.00	23.00	121.44		11.00	58.08		34.00	179.52	22.67	116.00	612.48	77.33%
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	10.00	29.50					10.00	29.50	58.75	7.02	20.71	41.25%
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58												
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	45.00	898.20		8.70	173.65		53.70	1,071.85	89.50	6.30	125.75	10.50%
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFICADO	M3	0.30	119.50	35.85	-	-					-	-	-	0.30	35.85	100.00%
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	15.00	103.35					15.00	103.35	88.24	2.00	13.78	11.76%
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10												
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	40.00	1,172.40		1.80	52.76		41.80	1,225.16	59.71	28.20	826.54	40.29%
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	10.00	82.60					10.00	82.60	11.11	80.00	660.80	88.89%
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47												
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	64.13	29,435.67		5.87	2,694.33		70.00	32,130.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boogules a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	3.00	82.47					3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00%
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66												
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	28.75	3,774.88		15.68	2,058.78		44.43	5,833.66	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16												
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	274.22	5,775.07		127.65	2,688.31		401.87	8,463.38	71.63	159.13	3,351.28	28.37%
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	27.00	755.19		15.00	419.55		42.00	1,174.74	84.00	8.00	223.76	16.00%
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-					-	-	-	50.00	869.00	100.00%
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-					-	-	0.00%	50.00	1,475.00	100.00%
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	0.25	5,000.00		0.25	5,000.00		0.50	10,000.00	50.00	0.50	10,000.00	50.00%
09.00.00	DATACION				334.93												
09.00.04	ANALISIS OSTEOLOGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-					-	-	0.00%	0.07	766.90	1428.57%
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-					-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33												
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-					-	-	-	93.04	169.33	100.00%
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	5.86	29,661.58		0.01	59.46		5.87	29,721.04	83.92	1.13	5,695.18	16.08%
	COSTO DIRECTO				114,511.66		76,892.35			13,204.93			90,097.28	78.68		19,432.43	21.32
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00			0.00			0.00			5,766.65	48.65%
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		76,892.35			13,204.93			90,097.28			25,199.08	100.00%
	GASTOS GENERALES				3,540.70		4,001.42			0.00			4,001.42			0.00	0.00%
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		80,893.77	65.33		13,204.93	10.66	0.00	94,098.70	76.00		29,720.32	24.00

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo		-
5.11	Obligaciones del empleador		-
5.18	Bienes (vestuario)	1,379.01	1,379.01
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	111.10	111.10
5.21	aguinaldos fiestas patrias	1,997.21	1,997.21
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	114.10	114.10
	TOTAL	4,001.42	4,001.42

NOTA:

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que el expediente tecnico no consideraba el sueldo de la responsable para los 07 meses de ejecucion del proyecto. asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros.

asi mismo el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral. el presente mes de Agosto se valoriza el sueldo de la responsable en la partida Estudio e Interpretacion del material cultural.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014																	
PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	VALORIZAC. ANTERIOR			VALORIZAC. ACTUAL			VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR		
						METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21												0.00
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQU	BID	150.00	5.28	792.00	34.00	179.52		116.00	612.48		150.00	792.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	10.00	29.50		7.02	20.71		17.02	50.21	100.00	0.00	0.00	0.00%
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58												35.85
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	53.70	1,071.85		6.30	125.75		60.00	1,197.60	100.00	0.00	0.00	0.00%
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIF	M3	0.30	119.50	35.85										0.30	35.85	100.00%
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	15.00	103.35		2.00	13.78		17.00	117.13	100.00	0.00	0.00	0.00%
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10												0.00
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	41.80	1,225.16		28.20	826.54		70.00	2,051.70	100.00	0.00	0.00	0.00%
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	10.00	82.60		80.00	660.80		90.00	743.40	100.00	0.00	0.00	0.00%
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47												0.00
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICO	M3	70.00	459.00	32,130.00	70.00	32,130.00					70.00	32,130.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boogules a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	3.00	82.47					3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00%
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66												0.00
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	44.43	5,833.66					44.43	5,833.66	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16												8,306.85
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	401.87	8,463.38		80.40	1,693.22		482.27	10,156.61	85.97	78.73	1,658.05	14.03%
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	42.00	1,174.74		8.00	223.76		50.00	1,398.50	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.03	CODIFICACION DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	-	-		40.00	695.20		40.00	695.20	80.00	10.00	173.80	20.00%
08.00.04	GLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-		-	-		-	-	0.00%	50.00	1,475.00	100.00%
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	0.50	10,000.00		0.25	5,000.00		0.75	15,000.00	75.00	0.25	5,000.00	25.00%
09.00.00	DATACION				334.93												
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-		-	-		-	-	0.00%	0.07	766.90	14.29
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-		-	-		-	-	0.00%	0.01	281.25	1.00
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33												0.00
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	-	-		93.04	169.33		93.04	169.33	100.00	0.00	0.00	0.00%
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA-PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	5.87	29,721.04		0.01	59.46		5.89	29,780.51	84.09	1.11	5,635.71	15.91%
	COSTO DIRECTO				114,511.66		90,097.28			10,101.04			100,198.31	87.50		8,342.70	12.50
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00			0.00			0.00			5,766.65	48.65%
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		90,097.28			10,101.04			100,198.31			14,109.35	100.00%
	GASTOS GENERALES				3,540.70		4,001.42			0.00			4,001.42			-460.72	0.00%
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		94,098.70	76.00		10,101.04	8.16		104,199.73	84.15		19,619.28	15.85

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo		-
5.11	Obligaciones del empleador		-
5.18	Bienes (vestuario)	1,379.01	1,379.01
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	111.10	111.10
5.21	aguinaldos fiestas patrias	1,997.21	1,997.21
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	114.10	114.10
	TOTAL	4,001.42	4,001.42

NOTA: el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que el expediente tecnico no consideraba el sueldo de la responsable para los 07 meses de ejecucion del proyecto. asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros.

el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral. el presente mes de Setiembre se valoriza el sueldo de la responsable en la partida Estudio e Interpretacion del material cultural.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014			VALORIZAC. ANTERIOR			VALORIZAC. ACTUAL			VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR				
			METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%		
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																		
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21												0.00		
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	BID	150.00	5.28	792.00	150.00	792.00					150.00	792.00	100.00	0.00	0.00	0.00%		
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	17.02	50.21					17.02	50.21	100.00	0.00	0.00	0.00%		
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58												35.85		
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	60.00	1,197.60					60.00	1,197.60	100.00	0.00	0.00	0.00%		
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFICADO	M3	0.30	119.50	35.85	-	-					-	-	-	0.30	35.85	100.00%		
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	17.00	117.13					17.00	117.13	100.00	0.00	0.00	0.00%		
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10												0.00		
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	70.00	2,051.70					70.00	2,051.70	100.00	0.00	0.00	0.00%		
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	90.00	743.40					90.00	743.40	100.00	0.00	0.00	0.00%		
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47												0.00		
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	70.00	32,130.00					70.00	32,130.00	100.00	0.00	0.00	0.00%		
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boquetes a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	3.00	82.47					3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00%		
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66												0.00		
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	44.43	5,833.66					44.43	5,833.66	100.00	0.00	0.00	0.00%		
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16												0.00		
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	482.27	10,156.61			78.73	1,658.05	561.00	11,814.66	100.00	0.00	0.00	0.00%		
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	50.00	1,398.50					50.00	1,398.50	100.00	0.00	0.00	0.00%		
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	40.00	695.20			10.00	173.80	50.00	869.00	100.00	0.00	0.00	0.00%		
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	-	-			50.00	1,475.00	50.00	1,475.00	100.00	0.00	0.00	0.00%		
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	0.75	15,000.00			0.25	5,000.00	1.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00%		
09.00.00	DATACION				334.93												1,048.15		
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	-	-			0.07	53.68	0.07	53.68	100.00	0.00	766.90	1428.57%		
09.00.05	EDICION E IMPRESIÓN DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ARQ	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-			-	-	-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%		
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33												0.00		
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	93.04	169.33					93.04	169.33	100.00	0.00	0.00	0.00%		
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	5.89	29,790.51			0.01	59.46	5.90	29,839.97	84.26	1.10	5,576.25	15.74%		
	COSTO DIRECTO				114,511.66		100,198.31				8,420.00		108,618.32	94.85		1,084.00	5.15		
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00				0.00		0.00			5,766.65	48.65%		
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		100,198.31				8,420.00		108,618.32			6,850.65	100.00%		
	GASTOS GENERALES				3,540.70		4,001.42				0.00		4,001.42			-460.72	0.00%		
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		104,199.73				84.15		8,420.00		6.80	112,619.74	90.96	11,199.28	9.04

NOTA:

el sueldo de la responsable del componente de investigacion se valoriza en la partida nueva Direccion y Gestion del PIA. creada por autorizacion verbal de la jefa de estudios y proyectos arquitecta Claudia Sotomayor, esto por que el expediente tecnico no consideraba el sueldo de la responsable para los 07 meses de ejecucion del proyecto. asi mismo no se considero presupuesto para bienes como vestuario, limpieza, medicamentos, material de escritorio aguinaldos y otros.

el sueldo de los demas meses se afectara en la partida de Estudio e Interpretacion del material cultural a consecuencia del expediente tecnico mal elaborado asi tambien por la demora en la obtencion de la Resolucion Directoral. el presente mes de Octubre se valoriza el sueldo de la responsable en la partida Estudio e Interpretacion del material cultural.

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo		-
5.11	Obligaciones del empleador		-
5.18	Bienes (vestuario)	1,379.01	1,379.01
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	111.10	111.10
5.21	aguinaldos fiestas patrias	1,997.21	1,997.21
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	114.10	114.10
	TOTAL	4,001.42	4,001.42

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105

CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	VALORIZAC. ANTERIOR			VALORIZAC. ACTUAL			VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR			
						METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																	
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21													0.00
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	BID	150.00	5.28	792.00	150.00	792.00					150.00	792.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	17.02	50.21					17.02	50.21	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58													35.85
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	60.00	1,197.60					60.00	1,197.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFICADO	M3	0.30	119.50	35.85	-	-					-	-	-	0.30	35.85	100.00%	100.00%
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	17.00	117.13					17.00	117.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10													0.00
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	70.00	2,051.70					70.00	2,051.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	90.00	743.40					90.00	743.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
04.00.00	EXCAVACIONES Y APISON				32,212.47													0.00
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	70.00	32,130.00					70.00	32,130.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en booguis a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	3.00	82.47					3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS				5,833.66													0.00
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	44.43	5,833.66					44.43	5,833.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16													0.00
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	561.00	11,814.66					561.00	11,814.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	50.00	1,398.50					50.00	1,398.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	50.00	869.00					50.00	869.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	50.00	1,475.00					50.00	1,475.00	10000.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00					1.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
09.00.00	DATACION				334.93													1,048.15
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	0.07	53.68					0.07	53.68	100.00	0.00	766.90	1428.57%	1428.57%
09.00.05	EDICION E IMPRESION DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ARC	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-					-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%	100.00%
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33													0.00
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	93.04	169.33					93.04	169.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	DIRECCION Y GESTION DEL PIA: PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	5.90	29,839.97		1.00	5,059.46		6.90	34,899.43	98.54	0.10	516.79	1.46%	1.46%
	COSTO DIRECTO				114,511.66		108,618.32			5,059.46			113,677.78	99.27		1,084.00	0.73	0.73
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00			0.00			0.00			5,766.65	48.65%	48.65%
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		108,618.32			5,059.46			113,677.78			6,850.65	100.00%	100.00%
	GASTOS GENERALES				3,540.70		4,001.42			0.00			4,001.42			-460.72	0.00%	0.00%
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		112,619.74	90.96		5,059.46	4.09		117,679.20	95.04		6,139.82	4.96	4.96

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo	-	-
5.11	Obligaciones del empleador	-	-
5.18	Bienes (vestuario)	1,379.01	1,379.01
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	111.10	111.10
5.21	aguinaldos fiestas patrias	1,997.21	1,997.21
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	114.10	114.10
	TOTAL	4,001.42	4,001.42

JUSTIFICACION: los trabajos realizados en el presente mes corresponden a la partida de Gestion y Direccion del PIA: plan de Monitoreo Arqueologico, según reprogramacion realizada por segunda vez en vista que la arqueologa supervisora del area Funcional de Patrimonio Arqueologico y de acuerdo al Reglamento de Intervenciones arqueologicas, es que el Plan de Monitoreo Arqueologico es hasta la culminacion de movimiento de tierra en la Obra, por lo que se realiza la programacion hasta el mes de Diciembre. reprogramacion presentada el 24 de Noviembre con el numero de informe 137.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
CUADRO DE VALORIZACION DEL MES DE DICIEMBRE 2014

RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

PRESUPUESTO DE PROGRAMACION 2014																	
PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	VALORIZAC. ANTERIOR		%	VALORIZAC. ACTUAL		%	VALORIZAC. ACUMULADA			SALDO A VALORIZAR		
						METRADO	PARCIAL		METRADO	PARCIAL		METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES																
01.00.01	AGUA PARA LA INVESTIGACION				842.21												0.00
01.00.02	AGUA PARA EL APISONADO DE LOS CUADROS DE INVESTIGACION ARQUE	BID	150.00	5.28	792.00	150.00	792.00					150.00	792.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
01.00.03	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS FACIL EXTRACCION	M2	17.02	2.95	50.21	17.02	50.21					17.02	50.21	100.00	0.00	0.00	0.00%
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				1,350.58												35.85
02.00.01	TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES	M2	60.00	19.96	1,197.60	60.00	1,197.60					60.00	1,197.60	100.00	0.00	0.00	0.00%
02.00.02	RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS REGISTRO CODIFIC	M3	0.30	119.50	35.85	-	-					-	-	-	0.30	35.85	100.00%
02.00.04	ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES A HOMBRO)	VJE	17.00	6.89	117.13	17.00	117.13					17.00	117.13	100.00	0.00	0.00	0.00%
03.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,795.10												0.00
03.00.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	70.00	29.31	2,051.70	70.00	2,051.70					70.00	2,051.70	100.00	0.00	0.00	0.00%
03.00.02	NIVELACION Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION	M2	90.00	8.26	743.40	90.00	743.40					90.00	743.40	100.00	0.00	0.00	0.00%
04.00.00	EXCAVACIONES				32,212.47												0.00
04.00.01	EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICOS	M3	70.00	459.00	32,130.00	70.00	32,130.00					70.00	32,130.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
04.00.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (en boogules a 200m.)	M3	3.00	27.49	82.47	3.00	82.47					3.00	82.47	100.00	0.00	0.00	0.00%
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMENTOS				5,833.66												0.00
07.00.01	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMENTOS	M3	44.43	131.30	5,833.66	44.43	5,833.66					44.43	5,833.66	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.00	RECUPERACION DEL MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO				35,557.16												0.00
08.00.01	REGISTRO ARQUEOLOGICO	M2	561.00	21.06	11,814.66	561.00	11,814.66					561.00	11,814.66	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.02	LAVADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	27.97	1,398.50	50.00	1,398.50					50.00	1,398.50	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.03	CODIFICADO DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	17.38	869.00	50.00	869.00					50.00	869.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.04	CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL	BOL	50.00	29.50	1,475.00	50.00	1,475.00					50.00	1,475.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
08.00.05	ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO	GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00					1.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
09.00.00	DATACION				334.93												281.25
09.00.04	ANALISIS OSTEOLÓGICO	CON	0.07	766.90	53.68	0.07	53.68					0.07	53.68	100.00	0.00	0.00	0.00%
09.00.05	EDICION E IMPRESIÓN DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGA	MLL	0.01	28,125.00	281.25	-	-					-	-	0.00%	0.01	281.25	100.00%
10.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				169.33												0.00
10.00.01	LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA	M2	93.04	1.82	169.33	93.04	169.33					93.04	169.33	100.00	0.00	0.00	0.00%
11.00.00	DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	7.00	5,059.46	35,416.22	6.90	34,899.43		0.10	516.79		7.00	35,416.22	100.00	0.00	0.00	0.00%
	COSTO DIRECTO				114,511.66		113,677.78			516.79			114,194.56	99.72			317.10
	IMPREVISTO (1.48%)				5,766.65		0.00		5,142.67				5,142.67				5,766.65
	TOTAL COSTO DIRECTO				120,278.31		113,677.78			5,659.46			119,337.23				6,083.75
	GASTOS GENERALES				3,540.70		4,001.42			0.00			4,001.42				-460.72
	TOTAL PRESUPUESTO				123,819.01		117,679.20	95.04		5,659.46	4.57		123,338.65	99.61			480.36

GASTOS GENERALES			
	ANTERIOR	V. ACTUAL	ACUMULADO
5.1	Retribuciones y Complementos a plazo fijo		-
5.11	Obligaciones del empleador		-
5.18	Bienes (vestuario)	1,379.01	1,379.01
5.19	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	400.00	400.00
5.2	Limpieza	111.10	111.10
5.21	aguinaldos fiestas patrias	1,997.21	1,997.21
5.45	Medicamentos	-	-
5.49	Materiales de escritorio	114.10	114.10
	TOTAL	4,001.42	4,001.42

JUSTIFICACION: los trabajos realizados en el presente mes corresponden a la partida de Gestion y Direccion del PIA: plan de Monitoreo Arqueológico, donde se realizan tramites para la entrega de material cultural asi como tambien se realiza la digitalizacion de los planos de planta, perfil estratigrafico y cortes de las diferentes unidades de excavacion y procesamiento de informacion para el informe final, en vista que no considero estas labores en el expediente tecnico. Asi mismo el presente mes la suscrita salio de vacaciones del 10 de Diciembre al 24 de Diciembre.

cabe indicar que el presente mes en la ejecucion de Obra Fisica no se realizo remocion o movimiento de suelos. asi mismo el presente mes se valoriza el sueldo y el aguinaldo de la responsable del CIA en el rubro de Imprevistos y en el saldo de la partida de Direccion y Gestion del PIA:PMA.

asi mismo cabe indicar que el presente mes se afecto en la ejecucion presupuestal en lo que corresponde a vestuario (terno saco y pantalon) con un monto de 444.00 nuevos soles de los que no existe ni la peca por lo que nos indican en el area de Abastecimiento que se anulara el mencionado orden de compra.,

MAYORES METRADOS				
DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
DIRECCION Y GESTION DEL PIA:PMA.	MES	0.90	5,059.46	4,542.67
AGUINALDOS POR NAVIDAD			600	600
VESTUARIO (TERNO SACO PANTALON)				0
TOTAL				5,142.67

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.**

SECTOR: 02 CULTURA

EJECUTORA: MC - CUSCO

Fecha: 06/01/2015

Hora: 09:03:07 AM

Página 1 de 1

EJECUCION MENSUAL POR META - AÑO 2014**0105: REC. M.V.R. IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO. Comp. INVEST.**

Cod Clasificador	Presupuesto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total Gasto	Saldo
213115	0.00	0.00	877.28	472.46	865.02	1143.49	1152.56	1165.77	826.39	1145.11	771.00	453.17	468.79	9341.04	-9341.04
262373	0.00	0.00	8487.00	4587.00	8491.96	11422.74	11520.20	13504.20	8312.52	11438.80	7544.00	4587.00	5187.00	95082.42	-95082.42
262374	0.00	0.00	0.00	0.00	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.50	-425.50
6.5.11.18	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
TOTAL:	0.00	0.00	9764.28	5059.46	9782.48	12566.23	12672.76	14669.97	9138.91	12583.91	8315.00	5040.17	5655.79	105248.96	-105248.96

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN**SECTOR: 02 CULTURA
EJECUTORA: MC - CUSCO

Fecha: 06/01/2015

Hora: 08:39:08 AM

Página 1 de 2

LISTADO DE REGISTROS DE AFECTACIONES**0105: REC. M.V.R. IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO. Comp. INVEST.**

N. Reg.	Fecha	CodDoc	Nro Doc	Detalle	CodMeta	Cod Clasificador	Monto Reg.
52.726	12/02/14	PLLA	14	Planilla Haberes-Jornales	0105	6.5.11.18	400.00
52.726	12/02/14	PLLA	14	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	404.82
52.726	12/02/14	PLLA	14	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	3900.00
52.879	26/02/14	PLLA	111	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	472.46
52.879	26/02/14	PLLA	111	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	4587.00
53.376	31/03/14	PLLA	118	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	472.46
53.376	31/03/14	PLLA	118	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	4587.00
53.491	08/04/14	O/C	294	BURGOS GIRALDO CARMEN GILDA	0105	26 2 3 7 4	425.50
53.955	29/04/14	PLLA	122	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	148.91
53.955	29/04/14	PLLA	122	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	1539.36
53.988	29/04/14	PLLA	125	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	716.11
53.988	29/04/14	PLLA	125	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	6952.60
54.420	30/05/14	PLLA	132	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	771.00
54.420	30/05/14	PLLA	132	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	7544.00
54.425	30/05/14	PLLA	129	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	372.49
54.425	30/05/14	PLLA	129	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	3878.74
55.260	27/06/14	PLLA	137	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	381.56
55.260	27/06/14	PLLA	137	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	3976.20
55.263	27/06/14	PLLA	140	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	771.00
55.263	27/06/14	PLLA	140	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	7544.00
56.133	24/07/14	PLLA	148	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	771.00
56.133	24/07/14	PLLA	148	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	8524.00
56.137	24/07/14	PLLA	144	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	394.77
56.137	24/07/14	PLLA	144	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	4980.20
57.254	29/08/14	PLLA	152	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	357.60
57.254	29/08/14	PLLA	152	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	3725.52
57.258	29/08/14	PLLA	156	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	468.79
57.258	29/08/14	PLLA	156	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	4587.00
58.211	30/09/14	PLLA	164	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	771.00
58.211	30/09/14	PLLA	164	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	7544.00
58.215	30/09/14	PLLA	160	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	374.11
58.215	30/09/14	PLLA	160	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	3894.80
59.275	30/10/14	PLLA	172	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	771.00
59.275	30/10/14	PLLA	172	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	7544.00
60.779	28/11/14	PLLA	180	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	453.17

RESPONSABLE: LIC. ARQ. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

25

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

N. Reg.	Fecha	CodDoc	Nro Doc	Detalle	CodMeta	Cod Clasificador	Monto Reg.
60.77 ⁶	28/11/14	PLLA	180	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	4587.00
61.28 ⁶	10/12/14	HCC	331	AGUINALDO EXTRAORDINARIO	0105	26 2 3 7 3	300.00
62.25 ¹	30/12/14	PLLA	188	Planilla Haberes-Jornales	0105	21 3 1 1 5	468.79
62.25 ¹	30/12/14	PLLA	188	Planilla Haberes-Jornales	0105	26 2 3 7 3	4887.00

Total General: 105248.96

I



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

0099	RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS. Comp. OBRAS DE ARTE.	2158470	658,240.00	0	51820.34	55521.77	55505.49	58695.56	59179.44	76725.77	61286.29	55811.37	57324.56	58244.15	70,123.49	658,238.23	0.72	100.00%
0100	RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS. Comp. INVESTIGACION.	2158470	198,962.00	0	9525.95	5525.51	17975.37	22530.44	19412.3	22761.4	19756.22	19205.17	19367.54	19154.9	23,746.52	198,961.32	0.68	100.00%
0101	RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS. Comp. SENSIBILIZACION.	2158470	20,114.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4763.68	4927.94	4912.71	5,509.08	20,113.41	0.59	100.00%
0102	RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO. Comp. INVESTIGACION.	2172969	261,769.00	0	9525.95	18232.86	25293.37	25681.33	28780.48	28026.64	25163.34	24452.76	23756.45	23013.94	29,840.64	261,767.76	1.24	100.00%
0103	RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO. Comp. BIENES CULTURALES.	2172969	695,860.00	0	49084.63	53430.49	62739.62	60755.25	66507.19	70788.74	55436.69	67562.99	58057.96	64638.99	86,855.72	695,858.27	1.73	100.00%
0104	RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO. Comp. SENSIBILIZACION.	2172969	60,434.00	0	0	2611.37	7344.63	6879.94	5565.92	5427.94	5046.44	7437.94	4927.94	4927.94	10,262.74	60,432.80	1.20	100.00%
0105	RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELÉN DE ACOMAYO. Comp. INVESTIGACION.	2158469	105,624.00	0	9764.28	5059.46	9782.48	12566.23	12672.76	14599.61	9138.91	12583.91	8315	5040.17	6,099.79	105,622.60	1.40	100.00%

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

INFORME JUSTIFICATORIO

Se informa que en la ejecución del Proyecto de Investigación Arqueológica se ocasiono un desfase presupuestal en el rubro de Gastos Generales en vista que la Resolución Directoral demoro para su aprobación un lapso de 06 meses en los que no se pudo ejecutar partidas del expediente tecnico, debido a que no se tenia la autorización para poder realizar remoción de suelo en el templo de Belen.

Cabe mencionar que el expediente de componente de Investigación Arqueológica en lo que corresponde al rubro de Gastos Generales estaba presupuestado con un monto de 23,066.60 nuevos soles monto que alcanzaria para el salario de la responsable del componente de Investigación por un lapso de 04 meses promedio, en el que en el expediente tecnico también no se considero presupuesto para el vestuario, aguinaldos, medicamentos, materiales de limpieza que son necesarios para la ejecución, pero en el transcurso por la espera de la aprobación de la Resolución Directoral se valorizo sin ejecutar partidas en vista que la firma de la responsable estaba comprometida.

Asi también para el mes de Febrero hubo reajustes de los haberes de todo el personal, entonces para este año 2014 no se tenia un monto presupuestal para el pago de la responsable del Componente de Investigación arqueológica y que por sugerencia e indicación de la jefa del área de Estudios y Proyectos la arquitecta Claudia Sotomayor se tubo que crear una nueva partida de Gestion y Direccion del Proyecto de Investigación Arqueologica:PMA por 07 meses asi también el sueldo de la responsable seria valorizada en la partida de Estudio e Interpretacion del Material Cultural por un lapso de 04 meses y 01 mes en lo que es imprevistos en la partida de Gestion y Direccion del PIA:PMA y asi se tendría un monto presupuestal para los 12 meses de ejecución del presente año.

Cabe indicar que se realizo una reprogramación hasta el mes de Diciembre por motivos que se obtuvo la resolución con plan de Monitoreo Arqueologico y que por indicación de la Inspectora Arqueologa Luz Marina Monroy, del Area Funcional de Patrimonio Arqueologico, se tenia que realizar el monitoreo hasta que se culmine remoción de suelos en obra, por lo que se realiza el Monitoreo Arqueologico solamente hasta el mes de Diciembre, motivos por que no se cuenta con presupuesto necesario y por conclusion de contrata por lo que yo como responsable del componente de investigación arqueologica deslindo responsabilidades y retiro mi firma del mencionado proyecto.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

05.00.- ANTECEDENTES HISTORICOS

Se recopiló datos que refieren sobre las prácticas mortuorias ya que por antecedentes de otras iglesias se sabe que el área de investigación está expuesta a evidencias de entierros.

Desde algunos abordajes materialistas, se ha intentado afrontar el estudio de los contextos arqueológicos mortuorios, en la búsqueda de reconocer la persona social. Así en el nivel individual, varios autores han sostenido que el conjunto de identidades sociales mantenidas durante la vida de un individuo (correspondientes con las diferentes categorías sociales reconocidas, sexo, edad, posición social, filiación social, condiciones de la muerte); aparecen representadas en forma de elementos dentro del contexto funerario. De esta forma podría establecerse una correspondencia entre las características funerarias contextuales (riqueza de ajuar, inversión de energía en el entierro, diversidad de elementos de ajuar) con la posición y categorías que ocupó el individuo en vida. (Gianotti, 1998:11).

“...el cuerpo bien puede ser enterrado intacto o después de su cremación; puede ser dejado por algún tiempo a la intemperie, a las aves de rapiña y a los chacales, para luego reunir algunos huesos representativos y enterrarlos piadosamente. Los entierros pueden ser en grupo o individuales. El muerto puede ser arrojado a la tierra sin objetos perdurables; puede ir acompañado de un tesoro... puede ser metido en una humilde vasija o en la envoltura de costoso sarcófago; su sepulcro puede no estar señalado por monumento alguno perdurable o puede estarlo “por un montículo en la loma, alto y ancho, con amplios wave-farers para ser visto”;(Wheeler, 1961:113).

“...Pero no todos los fieles de una parroquia tenían la posibilidad de ser enterrados dentro de su iglesia. Los más pobres, los esclavos, los extranjeros y, hasta el siglo XVIII, los niños pequeños eran sepultados fuera del templo, en el espacio llamado *cementerio*. Ya hemos dicho que los cementerios circundaban los muros exteriores de iglesias y ermitas, y eran el lugar que las parroquias debían obligatoriamente poner a disposición de cuantos carecieran de medios. La sepultura en el cementerio era gratuita.

En siglo XVII sólo se enterraban allí los pobres y los niños pequeños, de hasta siete años, y siempre que estuviesen bautizados. Incluso en los casos de familias de buena posición, con sepultura en propiedad o con capilla privada, los niños eran enterrados en el cementerio, sin acompañamiento, sin llanto y, a veces, sin misa ni funeral.

RESPONSABLE: LIC. ARQ. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Aunque estaban severamente prohibidos por la Iglesia, eran frecuentes los entierros secretos de niños, casi siempre por no hacer gasto. “La vida de un niño valía poco y, en consecuencia, lo mismo ocurría con su muerte”. Era general la falta de aprecio mostrada a los niños tanto en el plano familiar como en el educativo. Sólo a partir del siglo XVIII fue tomado en consideración el mundo de la infancia.


En 1786, para europa Carlos III dictó una ley sobre “Cementerios de las Iglesias: entierro y funeral de los difuntos” en la que se hacía saber que: *“Se harán los cementerios fuera de las poblaciones, siempre que no hubiera dificultad invencible o grandes anchuras dentro de ellos, en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias y distantes de las casas de vecinos, y se aprovecharán para capillas de los mismos cementerios las ermitas que existan fuera de los pueblos, como se ha empezado a practicar en algunos con buen suceso”.* (Pulido Castillo G. Profesor en el IES)

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

06.00.- ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO (POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN)

La Iglesia continua en proceso de Restauracion por el componente de Infraestructura en el transcurso del año se realizaron trabajos de calzadura de sobrecimiento, cimientto donde utilizaron elementos líticos de material canto rodado en ambos sectores de la Iglesia (exterior e interior), asi mismo se realizaron calzadura de muro con material adobe, en el sector A y sector B de la Iglesia, en lo que corresponde a los muro del Evangelio, muro Testero, y muro de la Epistola. Asi tambien se intervino en la recuperación y restauración de los contrafuertes del muro del Evangelio y del muro de la Epistola, asi como también se recuperara el ambiente que correspondia a la Sacristia en vista que se registro en las intervenciones de seguimiento de remoción de suelo el cimientto del mencionado ambiente, asi también se recupero el vano de acceso hacia la Sacristia ya que este en un inicio estaba tapiado y soterrado, del mismo modo se tuvo un avance mayor respecto al techo donde se realizo el cambio de la cubierta en el sector de la Nave y presbiterio, donde se realizo el retejado, asi también se realizo el embarre del muro del Testero.


PLANO DE DISTRIBUCION DE LA IGLESIA BELEN

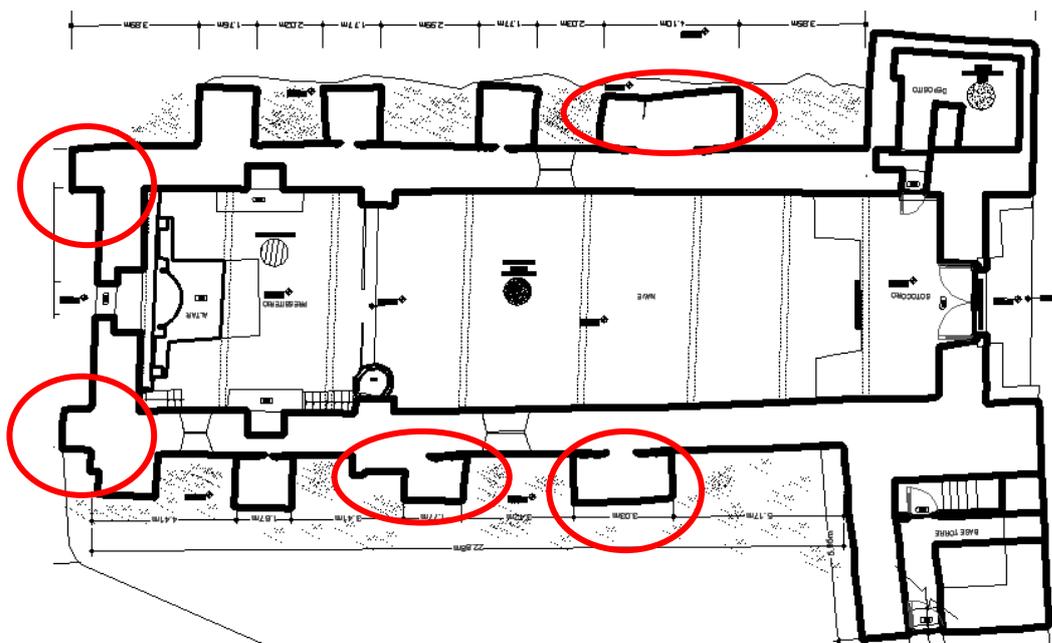

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

**IDENTIFICACION DE AREAS INTERVENIDAS RECUPERACION DE LOS CONTRAFUERTE
ORIGINALES**

IDENTIFICACION DE AREAS INTERVENIDAS DE LA IGLESIA BELEN

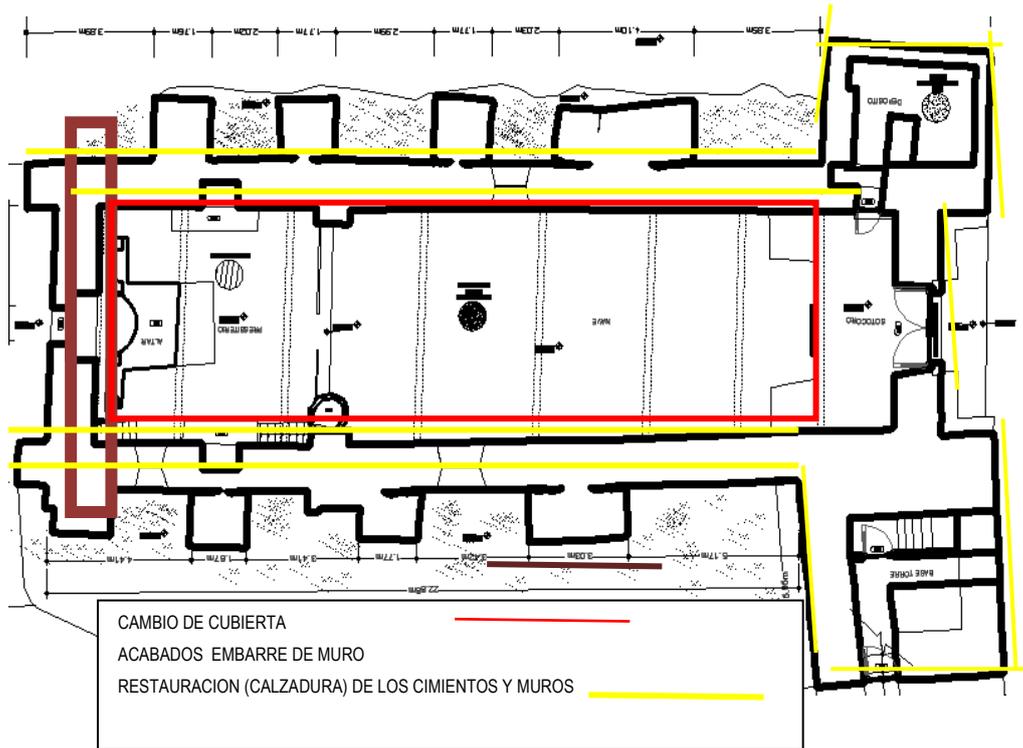

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

07.00.- ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL.

La Iglesia de Belén continúa en intervención, puesto que se encontró en pésimo estado de conservación.

A la fecha la Iglesia de Belén de Acomayo está en una intervención de un 70% en las que se ha intervenido los cimientos y sobrecimientos del muro Testero, muro del Evangelio, muro de la Epistola y muro de Pies, faltando un mínimo porcentaje de intervención de calzadura de cimiento en el muro de pies (interior), así como también por la torre del campanario lado norte, estos se encontraban antes de su intervención en pésimo estado de conservación deteriorados con grietas y pérdida de verticalidad a punto de colapsar, el resto de los paramentos exhibían desprendimientos de enlucidos de las estructuras murarias por falta de revoques.

De otro lado la estructura de techos fueron ya cambiados las cubiertas por el sector del Presbiterio y la Nave, esto antes de su intervención presentaba pandeamiento que determinaban la caída y descolocado de las tejas por lo que existía intersticios por donde había filtraciones de agua de lluvia (chorreras).

Así mismo se evidenció un vano tapiado en el muro de la Epistola la que fue deliberada, este vano era el acceso hacia la Sacristía..

08.00.- CAUSAS DE DETERIORO

PATOLOGIA - CAUSA DEL DETERIORO:

LESION : **Muros:** mecánicas de empujes y físicas grietas – fisuras, desprendimiento de material de construcción (adobe), humedad por filtraciones de aguas pluviales,
Acabados: Exfoliación, desprendimiento emboquillado y craquelamientos.
Cubiertas: desplazamiento de elementos de cobertura.

CAUSA : Empujes, Humedad.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

EVOLUCION : Activa

DIAGNOSTICO : Regular a pésimo.

09.00 INTERVENCIONES ANTERIORES

No se realizó intervención alguna por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura pero cabe mencionar que en la Iglesia de Belén, según datos etnohistóricos el año de 1951 hubo una refacción y a partir de esta a la fecha no se tuvo otra intervención, puesto que la reparación que se había hecho fue el adosado de contrafuertes a las paredes laterales y del testero, así también se registró el adosado de estructuras de adobe a los contrafuertes originales así también se registró el aumento de hiladas de adobes en los muros para elevar la cubierta y finalmente el techado de la iglesia.

En la actualidad la iglesia se halla en proceso de restauración donde se registró deterioro principalmente por los factores climáticos, de la cual los contrafuertes que fueron añadidos se demolieron y se restauraron en los sectores donde se evidenció la estructura original donde perdía la estabilidad y su posible ruina de la iglesia.

10.00 OBJETIVOS ALCANZADOS.

La Iglesia de Belén nos muestra las constantes refacciones y modificaciones en lo que corresponde a la volumetría, que tiene un proceso de uso que data desde la época de la colonia así como nos demuestra la evidencia de una campana en la torre del campanario del año 1721, también se evidenció otra campana que posiblemente sea del año 165X ya que es notorio las primeras 3 cifras y la última cifra está borrosa, pero por las características de las inscripciones que presenta es más antigua que la anterior.

Por las intervenciones Arqueológicas se pudo determinar o lograr los objetivos como:

- Se establecieron los factores de deterioro de la estructura de la iglesia, ya que este deterioro era causado por factores naturales como es la humedad ya que no se contaba con drenes de evacuación.
- Se recuperó el nivel de piso ya que este no estuvo tan soterrado por el sector A a diferencia del sector B, ya que en este sector el nivel de piso se registró a 1.50m de profundidad debido a que lo soterraron con la finalidad de dar soporte a la iglesia.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

- También se pudo determinar el estado actual de los cimientos así también las características constructivas, estos se encontraron en pésimo estado de conservación ya que se registró pandeamiento de las estructuras del cimiento y el material constructivo es el canto rodado el cual se encuentra en proceso de exfoliación.
- Se recuperó material cultural como son fragmentos de cerámica los que nos permiten elaborar el cuadro de ocupación y asociación cultural de la zona.
- Se logró evidenciar entierros cristianos múltiples entre primarios y secundarios de la época colonial y contemporánea así como fragmentos de cerámica y osamenta desarticulada en estado de descomposición, los cuales como en el caso de la cerámica fueron codificados, clasificados y analizados.
- Con respecto a los entierros hallados tanto en el interior como en el exterior del templo se logró determinar el patrón funerario de entierros cristianos, para lograr este objetivo se realizaron comparaciones con estudios de otros templos de la misma época en los cuales se repiten el mismo patrón funerario en lo que corresponden a entierros cristianos.
- El plan de mitigación se realizó con éxito durante toda la temporada que duró el presente Proyecto de investigación: plan de monitoreo arqueológico, en constante coordinación con la residencia de obra, especialmente para todos los sectores donde se ejecutó los trabajos de remoción de suelos programadas en el expediente de restauración los que corresponden tanto al interior como exterior del templo, para ello se han realizado diferentes recomendaciones para realizar trabajos diversos de manera que el nivel de impacto sea mínima en el monumento.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

11.00 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRABAJOS PRELIMINARES

PROGRAMACION DE OBRA

➤ **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

OE.9.1 OBRAS PRELIMINARES.

OE.9.1.2 AGUA PARA LA INVESTIGACION.

**OE.9.1.2.1 AGUA PARA EL APISONADO PARA LOS CUADROS DE
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA. (A 200M)**

Esta partida fue muy substancial para la ejecución del relleno de la unidades de excavacion.

Método de ejecución.- Partida que se realizo aproximadamente de 100 a 150 m. de distancia mediante bidones de 20 lts., este liquido se capto desde el riachuelo Cachimayo esto cuando secaba el agua de la pileta de la plazoleta de Belen que esta a menor distancia que el riachuelo se obtenia mediante manguera y luego fue depositado en un tanque de agua, ubicado próximo a la zona de intervención de las unidades,

Valorización.-Se Valoriza por Bidones.

UNID AD.	DESCRIPCIÓN	METRA DO	P.U.	PARCI AL
BID	Agua Para el Apisonado Para los Cuadros de Investigación Arqueológica. (a 200m)	150	5.28	792.00

OE.9.1.2.2 ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION.

Partida que consistió en la liberación de malezas y arbustos existente en las áreas de investigación en este caso se libero el kikuyo o grama.

Método de ejecución.- Esta actividad se realizo manualmente con la ayuda de herramientas como segaderas y rastrillos.

Valorización.-Se Valoriza por M2.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
---------	-------------	---------	------	---------

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

M2	Eliminación de Maleza y Arbustos de Fácil Extracción.	17.02	2.95	50.21
----	---	-------	------	--------------

OE.9.2 TRABAJOS PRELIMINARES.

OE.9.2.1 TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES:

Partida que consistió en el trazo de las unidades de excavación, de acuerdo al plano de unidades de excavación propuesto en el permiso solicitado al área de Coordinación de calificación de Intervenciones Arqueológicas.

Método de ejecución Esta actividad se realizó utilizando instrumentos como nivel aéreo, winchas de 5m y 50 m. lienzas y yeso para el marcado de las unidades de excavación trazadas.

Trabajos realizados en el **Sector "A"**, por el muro del Evangelio, muro de la Epistola así como por el sector de la Nave principal y por el Presbiterio. Así también en el **Sector B**. unidades de excavación adosadas al muro del Evangelio, muro de la Epistola, muro Testero así como en el muro de la Torres del Campanario y el muro de Pies en el acceso principal.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M2	Trazo de Unidades de Excavación y Niveles.	60	19.96	1,197.60

OE.9.2.2 RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS DISPERSOS (REGISTRO Y CODIFICADO)

Esta partida no se ejecutó a pesar que esta en el expediente como también dentro de la programación anual, en vista que no se evidenció mampuestos o elementos líticos que pertenecían a los cimientos de la estructura.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Recuperación de Elementos Líticos Dispersos (Registro y Codificado)	0.30	119.50	35.85

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

**OE.9.2.3 TRANSPORTE VEHICULAR DE MATERIALES A OBRA (CUSCO –ACOMAYO)
DISTANCIA 136KM (ida y retorno).**

Esta partida se ejecuto pero no se valorizo, a causa de que se requería deducir partidas para tener un **monto presupuestal en la partida nueva de Dirección y Gestión del PIA: PMA.** Para el sueldo de la responsable del componente de investigación Arqueologica en vista que es necesaria la presencia de la responsable en la ejecución del PIA.

Partida que consistio en transportar los materiales y bienes que se requieren en obra, para su ejecución de las partidas programadas, todo el material necesario (herramientas, materiales de construcción y otros), para las acciones de Investigación Arqueologica, adquiridas en la sede central (Cusco) y /o locales de los proveedores, los que fueron transportados hasta la zona de trabajo, en los vehículos de la institución.

Método de ejecución.- La ejecución de esta partida, consistio en que el volquete del Ministerio transportara los materiales requeridos a obra desde la ciudad del Cusco.

Valorización.- Se valoriza por m3.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Transporte de Material a Obra (Cusco - Acomayo) Distancia 136KM (ida y retorno).		84.85	

OE.9.2.4 ACARREO DE MATERIALES EN OBRA con (peones a hombro 50m).

En esta partida se realizo deductivos en vista que no es necesario realizar tantos metrados como esta programado en el expediente en vista que la distancia no es lejana para el traslado.

Partida que considero el traslado de materiales de construcción y de herramientas, desde el punto de descarguío a la zona de trabajo, cuyas distancias es corta de la plazoleta Belen hacia el almacen una distancia de 100 metros promedio.

Método de ejecución.- La ejecución de esta partida consistió, que el personal obrero acarrea sobre sus espaldas los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto.

Valorización.- Se valoriza por m3.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
VJE	Acarreo de Materiales en Obra con (Peones a Hombro 100m)..	17.00	6.89	117.13

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

OE.9.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

OE.9.3.1 NIVELACIÓN DE TERRENOS.

OE.9.3.1.1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO:

Esta partida corresponde al proceso de rellenar con el material extraído de cada unidad de excavación donde se respetó las características estratigráficas para no alterar la composición del terreno.

Método de ejecución.- Su procedimiento es devolver el material extraído con un apisonado de 0.20 m. capa por capa, apisonadas con un pisón de mano de vaciado de concreto de 30 x 30 x 20 cm. de 45 Kg. y riego con agua para lograr un nivel adecuado.

efectuado en forma manual con el apoyo de palas, estos trabajos se realizaron en Sector "A" (interior de la iglesia) y en el Sector "B" (exterior de la iglesia).

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Relleno con Material Propio	70	29.31	2,051.70

OE.9.3.1.2 NIVELACIÓN Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION

Partida que se ejecuta en los lugares donde se han realizado las excavaciones arqueológicas, previo un registro correspondiente, con la finalidad de devolver el nivel primigenio del piso el mismo que correspondió a la determinación de las evidencias o asociaciones que se hallaron en el proceso de excavación se realizó por capas de 0.20c.m., de altura que se apisona previo regado con agua.

Método de ejecución.- labor que consistió en el aplanamiento de los suelos de manera sistemática, consistió en horizontalizar espacios que corresponden a áreas abiertas y/o recuperación de niveles de piso de las áreas libres.

Esta labor consistió en el explanamiento del suelo de manera sistemática, con capas secuenciales de 0.20 m, apisonadas con un pisón de mano y con riego para lograr un nivel adecuado con el piso original.

. Estos trabajos se realizaron en Sector "A" (interior de la iglesia) y en el Sector "B" (exterior de la iglesia).

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M ²	Nivelación y Apisonado de los Cuadros de Excavación	90	8.26	743.40

OE.9.3.2 EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

La excavación consistió en la remoción de tierras con compromiso arqueológico en formas sistemática al interior y exterior de la iglesia, al igual que sobre los espacios abiertos anexos al área donde se ubica el monumento colonial religioso.

La exploración de muros se realizará siguiendo las pautas de las normas y tratados sobre la restauración, en las cuales se manifiestan de manera conjunta la exploración y excavación arqueológica antes de las intervenciones restaurativas como una garantía para la explicación morfológica, cronológica y de contexto de las estructuras a restaurar.

Es necesario indicar que para iniciar con las excavaciones arqueológicas fue necesario el contar con la Resolución de Aprobación del Proyecto de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo Arqueológico (con Excavación), el mismo que se obtuvo con un retraso de 06 meses.

Las excavaciones arqueológicas se realizaron en forma transversal, con la finalidad de registrar la existencia de material cultural, estructuras soterradas, características constructivas, superposición de estructuras, problemas estructurales, nivel de cimiento y otros aspectos técnicos. Los resultados obtenidos durante las investigaciones arqueológicas permiten la adecuada intervención restaurativa.

Método de ejecución.- La ejecución de esta partida consiste en el trazado de la unidad de excavación y se procedió con el decapado, esta labor se realizó con la ayuda de picotas, badilejos, brochas, el registro gráfico y fotográfico de la unidad, se realizó muy minucioso.

OE.9.3.2.1. EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICO.

La excavación arqueológica se intervino en áreas internas y externas del monumento colonial religioso Iglesia Belen de Acomayo, los mismos que por su forma y espacio tienen un porcentaje de avance, en vista que la investigación y el tratamiento es generalmente uniforme considerando la importancia del área y especificando la acción e incidiendo en el rendimiento.

La excavación arqueológica efectuada al interior en el sector A, sobre pisos compactos (Nave) se realizó la excavación de forma lenta por que se registro entierros, pisos tratados, etc, lo que hizo que el rendimiento y avance fuera menor.

En el sector B de igual manera se realizó la excavación de forma lenta porque también se registro entierros.

Método de Ejecución.- La excavación se realizó con personal obrero calificado durante el proceso de decapado, en el cual se utilizaron picotas, badilejos, brochas,

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

espátulas, zaranda entre otros equipos e instrumentos. Estos trabajos se realizaron en Sector "A"(interior de la iglesia) y en el Sector "B"(exterior de la iglesia).

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Excavación Arqueológica en Monumentos Histórico Artístico.	70	459.00	32,130.00

OE.9.3.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE. (En boguies a 200m).

Actividad que durante los trabajos de investigación se generaron material excedente se procedio a la eliminación del material excedente fuera del contexto arqueológico dejando los espacios o áreas intervenidas libres de todo residuo que no signifiquen mayor alteración en su contexto con fines de dejar libre el área de trabajo. Material que fue retirado a una distancia considerable que posibilite su uso posterior, en la nivelación de los pisos originales y relleno de las unidades aperturadas, así mismo contemplo la eliminación del material que sobro después de la intervención, de tal manera que estos excedentes, no sean obstáculos para transitar durante el proceso de trabajo dentro del área de intervención. Estos trabajos se realizaron en Sector "A"(interior de la iglesia) y en el Sector "B"(exterior de la iglesia).

Método de ejecución.- La partida consistió en el acarreo del material excedente en carretillas o boquies.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Eliminación de Material Excedente. (en Boguies A 200m).	3.00	27.49	82.47

OE.9.3.3 EXPLORACION E INTERPRETACIÓN DE MUROS.

OE.9.3.3.1 EXPLORACION E INTERPRETACION DE MUROS.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Esta partida no se ejecuto en vista que no se determino muros soterrados y se realizo deductivos en vista que se requiere monto presupuestal para crear la partida de Gestion y Direccion del PIA ya que es necesaria la presencia de la responsable para la ejecución de las demás partidas.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Exploración e Interpretación de Muros	5.00	87.54	

OE.9.3.4 EXPLORACION E INTERPRETACION DE CABECERAS DE MUROS.

OE.9.3.4.1 EXPLORACION E INTERPRETACION DE CABECERAS DE MUROS.

Esta partida no se ejecuto en vista que no se registro cabeceras de muros soterrados y se realizo deductivos, a causa que se necesita un monto presupuestal para la partida de Direccion y Gestion del PIA:PMA. Con el objetivo de valorizar el sueldo de la responsable del componente de investigación en esta nueva partida mencionada.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Exploración e interpretación de cabecera de muro.	5.00	87.54	

OE.9.3.5 EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS.

OE.9.3.5.1 EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS.

Luego de realizar la exploración arqueológica se prevé la interpretación de la cimentación previa lectura del comportamiento estructural del área de estudio con la recuperación estratigráfica y arquitectónica de espacios soterrados con evidencias de cimientos.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M3	Exploración e interpretación de cimientos.	44.43	131.30	5833.66

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

OE.9.4. RECUPERACION DE MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO ARQUEOLOGICO.

OE.9.4.2 REGISTRO ARQUEOLOGICO.

El registro arqueológico se realizó con la finalidad de registrar todas las evidencias que se muestran en las distintas etapas del proceso de excavación, es decir evidencias del material cultural que se presentó en cada estrato de ocupación humana el mismo que se realizó (antes, durante y después del proceso de excavación)

Metodología de Ejecución: se registro toda evidencia cultural antes, durante, y después de las excavaciones, realizándose dibujos de planos de planta, perfil estratigráfico, cortes, etc.

Estos trabajos se realizaron con el material cultural recuperado tanto del Sector "A" y Sector "B" de la iglesia.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M2	Registro Arqueológico.	561.00	21.06	11,814.66

Registro Escrito:

Durante las prospecciones superficiales e Iniciada la excavación arqueológica se realizó el registro escrito en forma minuciosa, para documentar técnicamente los operativos programados para lo cual se usarán fichas como son: diario de campo, fichas de registro de las excavaciones, fichas de registro de hallazgos, fichas de entierros (en caso de evidenciarse), ficha de arquitectura, etc.

Registro Grafico:

El registro grafico se realizó en forma permanente y minuciosa en las diferentes etapas de la Investigación Arqueológica y la Restauración, estos se realizaron con la finalidad de documentar gráficamente los hallazgos más representativos, así como los muros antes y después de su intervención para lo cual se realizarán planos de planta, alzados, secciones, reconstrucciones hipotéticas en diferentes escalas (1/20, 1/25, 1/50 y 1/100, en el caso de los hallazgos estos se dibujaron en escala 1/1 con sus respectivas secciones y reconstrucciones.

Registro Fotográfico:

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

El registro fotográfico fue de vital importancia en el desarrollo de la investigación arqueológica y para la restaurativa, por lo que se realizaron en forma permanente, para lo cual se usaron cámara digitales con una escala de madera de 1m y 0.5 m con la finalidad de registrar a detalle los hallazgos, capas, niveles, pisos, etc. En el caso del material cultural, los hallazgos más representativos fueron registrados minuciosamente acompañados de una escala pequeña.

OE.9.4.2.- LAVADO DE MATERIAL CULTURAL.

Esta actividad es parte de las labores de investigación arqueológica durante el periodo de trabajo de campo, lo cual implicó la limpieza adecuada de los elementos culturales recuperados durante las excavaciones arqueológicas, que fueron preparados para la fase de análisis. Estos trabajos se realizaron con el material cultural recuperado tanto del Sector "A" y Sector "B" de la iglesia.

Método de ejecución.- Los materiales culturales como: cerámica, y líticos fueron lavados con cepillo de cerda suave, con sumo cuidado a fin de no agredir las aplicaciones pictóricas de superficie, secados a la sombra, para evitar fisuras y agrietamientos por la brusca pérdida de humedad. El avance se calculó por bolsas con contenidos que no excedan de los 3 kg promedio.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
BOL	Lavado de Material Cultural.	50.00	27.97	1,398.50

OE.9.4.3.- CODIFICACION DE MATERIAL CULTURAL.

Esta actividad fue parte de las labores de investigación durante el periodo de trabajo de campo, lo cual implicó la codificación del material cultural (fragmento por fragmento), con la nomenclatura correspondiente y registro de muestras recuperadas para una posterior catalogación, evaluación e interpretación, con conocimientos del tema.

El avance se calculó por bolsas con contenidos que no excedan de los 3 kg promedio. Labores realizadas del sector "A" y sector "B" de la Iglesia.

Método de ejecución.- Los materiales culturales como: cerámica, líticos y otros fueron codificados con un pincel metálico y tinta china de color negro el avance se calculó por bolsas con contenidos que no excedan de los 3 kg promedio.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
BOL	Codificación de Material Cultural.	50.00	17.38	869.00

OE.9.4.4.- CLASIFICACIÓN DE MATERIAL CULTURAL.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Se clasifico; según la tipología, función y material empleado en su elaboración, asimismo se registro con detalle sus características y condiciones en fichas que se coloco en cada bolsa. Esta labor fue eminentemente de carácter técnico que lo realizo el responsable del proyecto y la bachiller en arqueología.

Método de ejecución.- Con respecto al análisis se ejecutaron con bastante rigurosidad, a fin de proceder a la interpretación científica de los diferentes especímenes culturales evidenciados en el proceso de la Investigación Arqueológica, pudiéndose llegar a la interpretación y comparación de las hipótesis planteadas en el proyecto, así contribuir al conocimiento científico del área arqueológica intervenida.

Estos trabajos se realizaran con el material cultural recuperado tanto del Sector “A” y Sector “B” de la iglesia.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
BOL	Clasificación de Material Cultural	50.00	29.50	1,475.00

OE.9.4.6 ESTUDIO E INTERPRETACION DEL MATERIAL CULTURAL REGISTRADO

Esta partida prevé el estudio e interpretación del material cultural recuperado en las unidades de excavación del sector A y sector B de la Iglesia, además del análisis del material cultural y su interpretación haciendo uso del método taxonómico aplicado en el material cultural recuperado durante el proceso de trabajos de campo.

Método de ejecución.- usando el método cuantitativo, cualitativo y de asociación, identificando la morfología, tipología, cronología y corología, aplicando para ello el método comparativo, lo que nos permitio efectuar la seriación y a su vez la datación relativa del material cultural sitio o su ubicación en el espacio.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
GLB	Estudio e Interpretación del Material Cultural Registrado	1.00	20,000.00	20,000.00

Cabe indicar que en esta partida se valorizo el salario de la responsable del componente de Investigacion Arqueologica.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

OE.9.5 DATACION.

OE.9.5.1 ANALISIS PALINOLOGICO:

Esta partida no se ejecuto a pesar que esta en el expediente tecnico debido a que no se obtuvo una muestra apropiada y optima para el análisis ya que en nuestra intervención se registro estratigrafía que estuvo conformado de: la capa I esta compuesto de un relleno contemporáneo y la capa II en algunos sectores correspondia a tierra limoarenosa o limoarcillosa y la capa III y IV correspondia a grava delgada con mezcla de arena.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
MUE	Análisis Palinológico.	1.00	3512.06	

OE.9.5.2 DATACION ABSOLUTA (C-14)

No se ejecuto esta partida porque no se registró una muestra aceptable como para realizar el análisis de radio carbono en vista que se evidenciaron estratos contaminadas y removidas.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
MUE	Analisis de Radio Carbono 14	1.00	2,112.00	

OE.9.5.3 ANALISIS DE TERMOLUMINICENCIA.

No se ejecuto esta partida en vista que no se registró una muestra apropiada para tal análisis.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
MUE	Análisis de Termoluminencia	1.00	462.06	

OE.9.5.4 ANALISIS OSTEOLÓGICO.

Se realizo el análisis óseo de los cuerpos que se evidenciaron en el sector A y Sector B de

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

la Iglesia, el proceso previo fue lento y minucioso. El trabajo de análisis comienza una vez que los arqueólogos han delimitado el área donde se ubican las evidencias (tumbas, entierros, etc.). Se retiraron las cubiertas y se fueron bajando paulatinamente niveles de tierra hasta dejar el cuerpo al descubierto y poder comprobar su posición y estado de conservación, mientras se realizaba el estudio fotográfico correspondiente.

Método de ejecución.-Una vez que podemos contemplar el cuerpo, se estudio su estado y la conexión anatómica del mismo—si los huesos están o no articulados si presentan algunas patologías y se intenta determinar el rango de la edad. No obstante, los resultados fiables se desprenden del análisis óseo que se realiza posteriormente en el laboratorio. Una vez estudiados los cuerpos científicamente.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
CON	Análisis Osteológico.	0.07	766.90	53.68

OE.9.5.5 EDICION E IMPRESIÓN DE LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA-

Esta partida no se ejecuto a pesar que se encuentra dentro del Expediente Integral de Obra asi como en la programacion, debido a que se deducio la partida en vista que se requería un monto presupuestal para la partida de Direccion y Gestion del Proyecto de Investigacion Arqueologica: PMA. Con el objetivo de valorizar el sueldo de la responsable del componente de investigación ya que era necesaria la permanencia de la responsable para que se termine con la ejecución de las partidas del expediente tecnico del componente de Investigacion Arqueologica.

Asi también por el proceso de investigación de corto tiempo, no se obtuvo datos relevantes como para editar el libro, es también razón por lo que no se ejecuta la mencionada partida ya que es necesario el apoyo de un historiador asi como también se requiere de tiempo para obtener datos bibliográficos y corroborar la información.

Y en el expediente no esta programado el cronograma para tal fin, asi mismo se converso con el editor de la institución Sr. Nieto donde nos indica que esta edición se realiza en un periodo de 03 meses con anticipacion como minimo.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
MLL	Edición e impresión de libro	0.75	28,125.00	281.25

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

--	--	--	--	--

OE.9.6 VARIOS LIMPIEZA Y JARDINERIA.

OE.9.6.1. LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA

Finalizados los trabajos programados se procedio a la limpieza general de todas las áreas intervenidas, dejando la zona totalmente limpia y expedita para los fines correspondientes. Estos trabajos se realizaran tanto del Sector "A"(interior del templo) como del Sector "B"(exterior del templo) donde estaban ubicadas nuestras unidades de excavación.

En esta acción se considero el retiro de todo el material exedente (concreto, Gramas y otros) durante los trabajos de excavación Arqueologica, el material se retiro fuera del sector de intervención.

Método de ejecución.- El personal obrero para esta actividad utilizo palas, picos y carretillas como saquillos y se trasladaron a un lugar sin compromiso arqueológico.

UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
M2	Limpieza Final del Área Investigada	93.04	1.82	169.33

OE.9.6 DIRECCION Y GESTION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA

Esta partida es creada debido a que no se tiene presupuesto en el rubro de Gastos Generales debido a un desfase presupuestal que se ocasiono por la demora de 06 meses en la aprobación de la Resolución Directoral, por lo que se creo la partida de Direccion y gestión del PIA con la finalidad de valorizar el sueldo de la responsable en esta nueva partida.

La Responsable del Proyecto de Investigación Arqueológica se ocupo de la dirección y coordinación permanente de los trabajos de Investigación arqueológica en todo el proceso de Investigación.

Se Coordino acciones concernientes al Proyecto de Investigacion Arqueologica, con el personal a su cargo, revisando los trabajos de campo y gabinete.

Presentando informes mensuales preliminares y final del avance de investigación.

Esta partida se valorizo los primeros meses del año hasta el séptimo mes.

RESPONSABLE: LIC. ARQ.LA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Así mismo la responsable cumple con las labores de:

- **DIGITALIZACION DE PLANOS ARQUEOLOGICOS.-** Esta labor no esta considerada en el expediente tecnico sin embargo es necesario la que corresponde a la acción de digitalizar toda la información grafica obtenida en el campo, para ser presentada en el informe final del proyecto de Investigacion Arqueologica.
- **PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL INFORME FINAL.-** Esta labor también es necesaria en la que se realiza el procesamiento y sistematización de toda la información escrita, grafica y fotográfica obtenida en campo para adjuntar en el informe final. Labor que también no esta considerada en el expediente tecnico.


UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	METRADO	P.U.	PARCIAL
Mes	Dirección y Gestion del PIA:PMA	7.00	5,059.46	35,416.22

RESULTADOS DE ANALISIS

RESULTADO DEL ANALISIS BIOARQUEOLOGICO IN SITU DE LAS OSAMENTAS HUMANAS PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DEL P.I.A. “RMVR Iglesia Belen de Acomayo”.

Así mismo se solicito Analisis de los restos oseos evidenciados en el sector “A” y sector “B” de la Iglesia. Analisis que fue realizado por el área de Laboratorio de la Direccion, **se obtuvo los resultados, por parte de la Antropologa Fisica Elva Torres y la Br. Arqueologa Carla, (Se adjunta las copias de los resultados).**

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

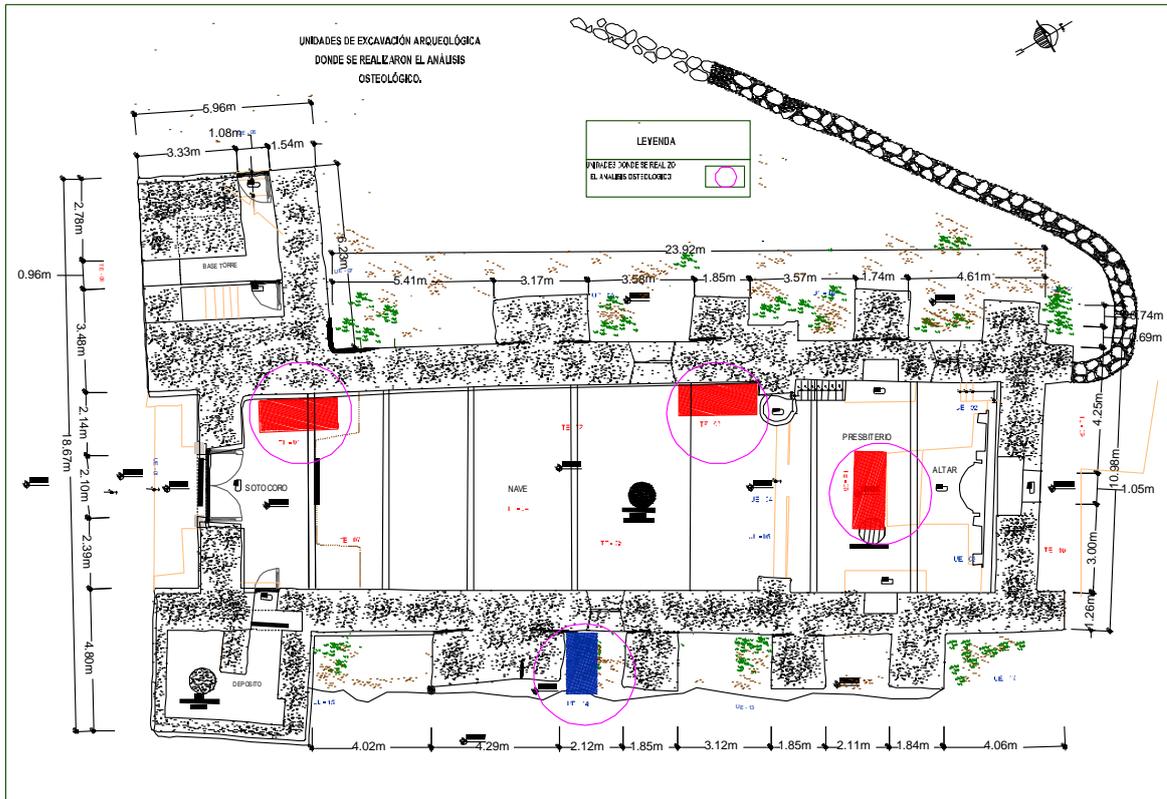

UNIDADES DE EXCAVACION DONDE SE REALIZARON EL ANALISIS OSTEOLÓGICO.

De los resultados obtenidos se pudo determinar que los entierros analizados corresponden a individuos de diferentes edades, y que estas estuvieron enterradas en ataúdes de madera y algunos en fosas cavadas con el cráneo a un nivel más alto que el resto del cuerpo.

Respecto a las denticiones todos los individuos presentan atrición dental.

RESULTADO DEL ANALISIS FISICO QUIMICO DE LOS OBJETOS ARQUEOLOGICOS PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DEL P.I.A. “RMVR Iglesia Belen de Acomayo”. (MUESTRA DE TEXTIL)

Se adjunta los resultados.

Los textiles llevados a análisis nos indican que estuvieron hechos con metal (cobre) los que ornamentaban el ataúd, esto nos indicaría que en el templo de belen se enterraron algunos individuos que tenían un poder económico en su época.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

RESULTADO DEL ANALISIS FISICO QUIMICO de OBJETOS ARQUEOLOGICOS PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DEL P.I.A. “RMVR Iglesia Belen de Acomayo”. (MUESTRA DE PISO DE TIERRA) se adjunta los resultados.

Se mando una muestra de tierra que correspondia al piso de la Iglesia en el que el objetivo era determinar los granulos de color blanco a que composición correspondia en el que en el resultado nos indica la densidad la porosidad, humedad y que esta compuesto de arena limo y arcilla.

ALGUNAS ACLARACIONES RESPECTO A LA EJECUCION FISICA DENTRO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA.

Sobre el tema debo manifestar lo siguiente:

- En la valorización del rubro de gastos generales se excedio en un porcentaje a consecuencia de que en el expediente tecnico no se a considerado lo que son materiales de seguridad como vestuario, medicamentos material de escritorio y de limpieza, asi también hubo reajuste de los haberes del personal profesional, (Arqueólogo

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Responsable del Componente de Investigación). cabe indicar que todo lo mencionado afectó el presupuesto programado en el presente año del Componente de Investigación.

- En lo que corresponde a las partidas donde no se llegó al 100% en su ejecución, son los siguientes:
- **Transporte vehicular de materiales a obra.-** se ejecutó esta partida pero no se valorizó debido a que se realiza deductivo de esta partida con el objetivo de adicionar monto presupuestal para la partida de Dirección y Gestión del PIA:PMA.
- **Exploración e interpretación de muros.-** no se ejecuta esta partida debido a que no se registró algún muro soterrado.
Se realiza deductivo por la necesidad de obtener un monto presupuestal para la partida de Dirección y Gestión del PIA: PMA.
- **Exploración e interpretación de cabecera de muros.-** no se ejecuta esta partida debido a que no se evidenció ningún muro por lo que se realizó deductivo de esta partida para obtener un monto presupuestal para la partida de dirección y Gestión del PIA:PMA y así valorizar el sueldo del personal profesional.
- **Análisis de Radio Carbono 14.-** no se realiza esta partida debido a que no se evidenció una muestra adecuada para tal análisis.
- **Análisis palinológico.-** de igual manera no se ejecutó esta partida debido a que no se tenía una muestra óptima debido a que la estratigrafía presente en las unidades está compuesta por relleno, seguido por un estrato removido y posterior a este se registró cascajo o grava.
- **Análisis de termoluminiscencia.-** se realizó deductivo de esta partida debido a que no se registró una muestra adecuada para tal análisis..
- **Edición e Impresión de libro con los resultados de la Investigación Arqueológica.-** no se realiza esta partida en vista que se tubo que deducir metrados para tener monto presupuestal en la partida nueva de Dirección y Gestión del PIA, también se necesita de

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

mas tiempo y puesto que no se tiene presupuesto para el sueldo del personal profesional (Arqueólogo).

Asi también se tuvo la necesidad de adicionar y crear la partida de:

- **Dirección y Gestión del PIA: PMA.**- partida que fue necesario, para valorizar el sueldo del personal profesional (arqueólogo), ya que la permanencia de la responsable es necesaria para la ejecución.
- Asi mismo cabe aclarar que hubo problemas para contratar el personal en vista que la ejecución de la obra era programada por 06 meses, el personal no aceptaba por el corto tiempo en donde se ocasiono abandono de trabajo tanto del personal obrero asi como del personal asistente de arqueología en las que ocasionaron retrasos en la ejecución. Cabe mencionar también que el personal asistente arqueólogo abandono el trabajo sin dejar información necesaria para el informe final por lo que la suscrita tuvo que realizar las digitalizaciones de los planos, diarios de campo, registros de excavación etc.

CONCLUSIONES

En las estructuras murarías de la iglesia se identificaron las Causas y Lesiones.

Se registro humedad en las estructuras de los cimientos de los muros de la Iglesia, por filtración; Las estructuras arquitectónicas de los muros estuvieron por colapsar con una inclinación hacia el interior esto por la filtración de las aguas pluviales.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Asi mismo **por erosión atmosférica:** pérdida superficial del material, donde se registro el material lítico en proceso de exfoliación.

Gran parte de las estructuras de los cimientos se evidenciaron pandeadas con desplome, con una inclinación hacia el interior asi también se registro desprendimiento del material lítico por falta de adherencia entre elemento y aglutinante.

Asi mismo el pandeamiento del muro de la Epistola fue a causa de factores naturales como son las raíces de los arbustos de pino que crecían por este sector los que se incrustaron hasta 1.30 m de profundidad en la parte interior de la Iglesia afectando los cimientos de los muros de la iglesia.

PROBLEMÁTICA DE OBRA

- Los Metrados de la Partidas Programadas en el presente año, se Ejecutaron a un 99.61 %, no llegando al 100.00%, las causas para no cumplir con las metas programadas fue el retraso que se presento en la obtención de la Resolucion Directoral de 06 meses, en el que se ocasiono un desfase presupuestal en el rubro de gastos generales por

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

lo que se realizo reprogramación creándose la partida nueva de Gestion y Direccion del PIA.PMA en la que la presencia de la responsable del componente fue necesaria para la ejecución de las partidas del expediente del componente de Investigacion Arqueologica.

- Cabe aclarar que el mes de Diciembre se realizo una variación presupuestal anual por parte de la oficina de Planificacion y presupuesto (OPP), de forma inconsulta donde se disminuyo el monto inicial presupuestal de S/. 123,819.00 al monto de S/.105,624.00, por lo que hubo una disminucion de S/. 18,195.00 que afecto presupuestalmente.

RECOMENDACIONES

Antes de dar inicio a las labores de Restauración, deben anteceder los trabajos de Investigación Arqueológica para no tener retrasos en el proceso de los trabajos restaurativos.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Se recomienda para próximos expedientes que se considere en el presupuesto de Gastos Generales para abastecimiento de material de seguridad, material de limpieza, escritorio, aguinaldos así como el sueldo de la Arqueóloga por el tiempo de ejecución del expediente así también prevenir salario para la obtención de la Resolución Directoral en vista que la firma está comprometida, es por estas razones que se ocasiona un desfase presupuestal en cuanto al rubro de gastos Generales.

Se recomienda que después de la Investigación se debiera de considerar un Plan de Monitoreo Arqueológico para realizar el seguimiento a remoción de suelo hasta que en obra culminen los trabajos de movimiento de suelos.

Así mismo se recomienda que si en obra física continúa remoción de suelos se considere a una arqueóloga monitorea para que realice el Monitoreo Arqueológico.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

12.- EJECUCION DE PROGRAMACION GENERAL DE OBRA, REFERIDA A LA PROGRAMACION APROBADA (CUADROS)

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105 PRESUPUESTO ANALITICO 2014 (COSTO TOTAL) RESPONSABLE: LIC. ARQL° NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI			
--	--	--	--

PARTIDA	ESPECIFICACIONES		MONTO
	COSTO DE INVERSION	PROGRAMADO	123,819.00
		EJECUTADO	98,484.06
2.6.2.3.73	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	PROGRAMADO	100,694.68
		EJECUTADO	94,057.14
2.6.2.3.74	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	PROGRAMADO	23,124.32
		EJECUTADO	4,426.92
2.6.2.3.75	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	-
2.6.2.3.76	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	-
TOTAL		PROGRAMADO	123,819.00
		EJECUTADO	98,484.06

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - CUSCO SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105 PRESUPUESTO ANALITICO 2014 (COSTO INDIRECTO) RESPONSABLE: LIC. ARQL° NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI			
--	--	--	--

PARTIDA	ESPECIFICACIONES		MONTO
	COSTO DE INVERSION	PROGRAMADO	123,819.00
		EJECUTADO	4,001.42
2.6.2.3.73	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	PROGRAMADO	0.00
		EJECUTADO	-
2.6.2.3.74	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	PROGRAMADO	3,540.70
		EJECUTADO	4,001.42
2.6.2.3.75	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	PROGRAMADO	0.00
		EJECUTADO	-
2.6.2.3.76	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	PROGRAMADO	0.00
		EJECUTADO	-
TOTAL		PROGRAMADO	3,540.70
		EJECUTADO	4,001.42

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105 PRESUPUESTO ANALITICO 2014(COSTO DIRECTO) RESPONSABLE: LIC. ARQL° NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI			
---	--	--	--

PARTIDA	ESPECIFICACIONES		MONTO
	COSTO DE INVERSION	PROGRAMADO	123,819.00
		EJECUTADO	94,482.64
2.6.2.3.73	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	PROGRAMADO	100,694.68
		EJECUTADO	92,057.14
2.6.2.3.74	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	PROGRAMADO	19,583.62
		EJECUTADO	425.50
2.6.2.3.75	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	-
2.6.2.3.76	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	-
TOTAL		PROGRAMADO	120,278.30
		EJECUTADO	92,482.64

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
 SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL.
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CRONOGRAMA DE INVERSION POR PARTIDAS (Costo Total)
 OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
 RESPONSABLE: LIC. ARQLº. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

MESES		2,6,2,3,7,3	2,6,2,3,7,4	2,6,2,3,7,5	2,6,2,3,7,6	TOTAL
		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	MENSUAL
	PROG.	5,059.46	-			5,059.46
ENE	EJEC.	4,704.82	-	-	-	4,704.82
	PROG.	5,059.46				5,059.46
FEB	EJEC.	5,059.46	400.00	-	-	5,459.46
	PROG.	5,059.46	-		-	5,059.46
MAR	EJEC.	5,059.46	-	-	-	5,059.46
	PROG.	13,500.00	808.14	-	-	14,308.14
ABR	EJEC.	9,356.98	425.50	-	-	9,782.48
	PROG.	13,500.00	808.14	-	-	14,308.14
MAY	EJEC.	12,566.23	1,033.21	-	-	13,599.44
	PROG.	13,500.00	808.14	-	-	14,308.14
JUN	EJEC.	12,672.76	415.50	-	-	13,088.26
	PROG.	13,500.00			2,000.00	15,500.00
JUL	EJEC.	12,599.61	155.50	-	1,997.21	14,752.32
	PROG.	11,981.00	308.14	-	-	12,289.14
AGOS	EJEC.	9,138.91	-	-	-	9,138.91
	PROG.	13,500.00	808.14	-	-	14,308.14
SET	EJEC.	12,583.91	-	-	-	12,583.91
	PROG.	8,500.00	-	-	-	8,500.00
OCT	EJEC.	8,315.00	-	-	-	8,315.00
	PROG.	5,059.46		-	-	5,059.46
NOV	EJEC.	5,040.17	-		-	5,040.17
	PROG.	5,059.46	5,000.00	-	-	10,059.46
DIC	EJEC.	5,655.79	-	-	-	5,655.79
	PROG.	113,278.30	8,540.70	-	2,000.00	123,819.00
TOTAL	EJEC.	102,753.10	2,429.71	-	1,997.21	107,180.02

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULURA CUSCO SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CRONOGRAMA DE INVERSION POR PARTIDAS (Costo Indirecto) OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO RESPONSABLE: LIC. ARQLº. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI						
MESES		2,6,2,3,7,3	2,6,2,3,7,4	2,6,2,3,7,5	2,6,2,3,7,6	TOTAL
		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	MENSUAL
	PROG.	-				-
ENE	EJEC.	-				-
	PROG.	-				-
FEB	EJEC.	-	400.00			400.00
	PROG.	-	-	-		-
MAR	EJEC.	-	-	-		-
	PROG.	-	308.14	-		308.14
ABR	EJEC.	-		-		-
	PROG.	-	308.14			308.14
MAY	EJEC.	-	1,033.21	-		1,033.21
	PROG.	-	308.14	-		308.14
JUN	EJEC.	-	415.50	-		415.50
	PROG.	-			2,000.00	2,000.00
JUL	EJEC.	-	155.50	-	1,997.21	2,152.71
	PROG.	-	308.14	-		308.14
AGOS	EJEC.					-
	PROG.	-	308.14	-		308.14
SET	EJEC.					-
	PROG.		-	-		-
OCT	EJEC.		-			-
	PROG.			-		-
NOV	EJEC.		-			-
	PROG.		-	-	-	-
DIC	EJEC.		-			-
	PROG.	-	1,540.70	-	2,000.00	3,540.70
TOTAL	EJEC.	-	2,004.21	-	1,997.21	4,001.42

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CRONOGRAMA DE INVERSION POR PARTIDAS (Costo Directo)
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
RESPONSABLE: LIC. ARQLº. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

MESES		2,6,2,3,7,3	2,6,2,3,7,4	2,6,2,3,7,5	2,6,2,3,7,6	TOTAL
		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	MENSUAL
	PROG.	5,059.46				5,059.46
ENE	EJEC.	4,704.82				-
	PROG.	5,059.46				5,059.46
FEB	EJEC.	5,059.46				-
	PROG.	5,059.46	-		-	5,059.46
MAR	EJEC.	5,059.46	-			-
	PROG.	13,500.00	500.00	-	-	14,000.00
ABR	EJEC.	9,356.98	425.50			-
	PROG.	13,500.00	500.00	-	-	14,000.00
MAY	EJEC.	12,566.23	-			-
	PROG.	13,500.00	500.00	-	-	14,000.00
JUN	EJEC.	12,672.76	-			-
	PROG.	13,500.00				13,500.00
JUL	EJEC.	12,599.61	-			12,599.61
	PROG.	11,981.00		-		11,981.00
AGOS	EJEC.	9,138.91				9,138.91
	PROG.	13,500.00	500.00	-		14,000.00
SET	EJEC.	12,583.91				12,583.91
	PROG.	8,500.00	-	-		8,500.00
OCT	EJEC.	8,315.00				8,315.00
	PROG.	5,059.46		-		5,059.46
NOV	EJEC.	5,040.17	-	-		5,040.17
	PROG.	5,059.46	5,000.00	-	-	10,059.46
DIC	EJEC.	5,655.79	-	-		5,655.79
	PROG.	113,278.30	7,000.00	-	-	120,278.30
TOTAL	EJEC.	102,753.10	425.50	-	-	103,178.60

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.****MINISTERIO DE CULTURA****DIRECCION DESCENCONTRADA DE CULTURA CUSCO****SUB DIRECCION DESCENCONTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL****AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES****OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO****COMOPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105****CRONOGRAMA DE EJECUCION TOTAL VALORIZADO**

RESPONSABLE: LIC. ARQL° NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI

CRONOGRAMA DE EJECUCION TOTAL VALORIZADO

2014

PARTIDAS	DESCRIPCION DE PARTIDAS GENERICAS DE OBRA		2014												TOTAL	
			TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM		DIciem
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES															
02.00.00	AGUA PARA LA INVESTIGACION	PROG.	842.21					168.44	168.44	168.44	168.44	168.44				842.21
		EJEC.	0.00					14.75	14.75	121.44	58.08	633.19				842.21
03.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES	PROG.	1,350.58			0.00	225.10	225.10	225.10	225.10	225.10	225.10				1,350.58
		EJEC.	0.00				179.64	283.95	219.56	318.40	173.65	139.53				1,314.73
04.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROG.	2,795.10			0.00	465.85	465.85	465.85	465.85	465.85	465.85				2,795.10
		EJEC.	0.00							1,255.00	52.76	1,487.34				2,795.10
05.00.00	EXCAVACIONES	PROG.	32,212.47			0.00	5,368.75	5,368.75	5,368.75	5,368.75	5,368.75	5,368.75				32,212.47
		EJEC.	0.00				6,104.65	8,702.54	7,068.60	7,642.35	2,694.33					21,875.79
06.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE MUROS	PROG.	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		EJEC.	0.00													0.00
07.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CABECERAS DE MUROS	PROG.	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		EJEC.	0.00													0.00
08.00.00	EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS	PROG.	5,833.66			0.00		1,166.73	1,166.73	1,166.73	1,166.73	1,166.73				5,833.66
		EJEC.	0.00						1,641.25	2,133.63	2,058.78					1,641.25
09.00.0	RECUPERACION DE MATERIAL CULTURAL Y REGISTRO	PROG.	35,557.16			0.00		5,926.19	5,926.19	5,926.19	5,926.19	5,926.19	5,926.19			35,557.16
		EJEC.	0.00				900.53	1,621.62	1,590.88	7,417.23	8,107.86	7,612.18	8,306.85			4,113.03
10.00	DATACION	PROG.	334.93			0.00	0.00	0.00	0.00				334.93			334.93
		EJEC.	0.00										53.68			0.00
11.00	VARIOS LIMPIEZA Y JARDINERIA	PROG.	169.33				0.00	0.00	0.00	56.44	56.44	56.44				169.33
		EJEC.	0.00									169.33				169.33
12.00	DIRECCION DEL PIA:PMA.	PROG.	35,416.22	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46		5,059.46		35,416.22
		EJEC.	0.00	4,304.82	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	5,059.46	59.46	59.46	59.46	59.46	5,059.45	516.79
	COSTO DIRECTO	PROG.	114,511.66	5,059.46	5,059.46	5,059.46	11,119.15	18,380.52	18,380.52	13,377.50	13,377.50	13,377.50	6,261.12	5,059.46		114,511.66
		EJEC.	0.00	4,304.82	5,059.46	5,059.46	12,244.28	15,682.32	15,594.50	18,947.51	13,204.93	10,101.04	8,420.00	5,059.45	516.79	
	IMPREVISTOS	PROG.	5,766.65					1,153.33	1,153.33	1,153.33	0.00	0.00			2,306.66	5,766.65
		EJEC.	0.00												5,142.67	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	PROG.	120,278.31	5,059.46	5,059.46	5,059.46	11,119.15	19,533.85	19,533.85	14,530.83	13,377.50	13,377.50	6,261.12	5,059.46	2,306.66	120,278.31
		EJEC.	0.00	4,304.82	5,059.46	5,059.46	12,244.28	15,682.32	15,594.50	18,947.51	13,204.93	10,101.04	8,420.00	5,059.45	5,659.46	
	GASTOS GENERALES	PROG.	3,540.70	442.59	442.59	442.59	442.59	442.59	442.59	442.59	442.59	0.00				3,540.70
		EJEC.	0.00	400.00				1,033.21	415.50	2,152.71						4,001.42
	TOTAL PRESUPUESTO	PROG.	123,819.01	5,502.05	5,502.05	5,502.05	11,561.74	19,976.44	19,976.44	14,973.42	13,820.09	13,377.50	6,261.12	5,059.46	2,306.66	123,819.01
		EJEC.	0.00	4,704.82	5,059.46	5,059.46	12,244.28	16,715.53	16,010.00	21,100.22	13,204.93	10,101.04	8,420.00	5,059.45	5,659.46	

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - CUSCO SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO COMPONENTE: INVESTIGACION ARQUEOLOGICA; META 0105 (INVESTIGACION ARQUEOLOGICA) CRONOGRAMA DE PERSONAL 2014 RESPONSABLE: LIC. ARQLO. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI														
PERSONAL		MESES												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
ARQUEOLOGO DIRECTOR DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ASISTENTE ARQUEOLOGO	PROGRAMADO		0	0	1	1	1	1	1	1			6	
	EJECUTADO				1	1	1	1	0	1	1		6	
OBRERO A	PROGRAMADO		0	0	0	0	0	1	1	1	1		4	
	EJECUTADO												0	
OBRERO B	PROGRAMADO		0	0	1	1	1	1	1	1			6	
	EJECUTADO				1	1	1	1	1	1			6	
OBRERO C (de la Zona)	PROGRAMADO		0	0	1	1	1	1	1	1			6	
	EJECUTADO				1	1	1	1	1	1			6	
TOTAL	PROGRAMADO	1	1	1	4	4	4	5	5	5	2	1	1	34
	EJECUTADO	1	1	1	4	4	4	4	3	4	2	1	1	30

RESPONSABLE: LIC. ARQLO. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN
DE ACOMAYO.**

MINISTERIO DE CULTURA CUSCO- DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
GASTOS GENERALES 2014
OBRA: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105
"INVESTIGACION ARQUEOLOGICA"
EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION 2014
RESPONSABLE: LIC. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

PRESUPUESTO TOTAL AÑO S/ 123819.00

GASTOS GENERALES MAXIMO S/ 3540.70

Nº	CONCEPTO		MESES	MONTO	TOTAL
1	ARQUEOLOGO DE OBRA	PROGRAMADO	-		-
		EJECUTADO	-	-	-
2	AGUINALDO POR ESCOLAR., F. PATRIA Y NAVIDAD	PROGRAMADO	1.00	2,000.00	2,000.00
		EJECUTADO		2,397.21	2,397.21
3	ADQ. DE ROLLOS FOTOGRAFICOS Y REVELADOS	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO	-	-	-
4	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PROGRAMADO	3.00	350.00	1,050.00
		EJECUTADO		114.10	114.10
5	MEDICINAS	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO	-	-	-
6	VESTUARIO	PROGRAMADO	-	490.70	490.70
		EJECUTADO		1,379.01	1,379.01
8	MATERIALES DE LIMPIEZA	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO		111.10	111.10
10	SOAT VEHICULAR	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO			-
11	BIENES DE CONSUMO	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO			-
12	SERVICIO POR TERCEROS	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO	-	-	-
13	SUPERVISION DE OBRA	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO	-	-	-
14	PLANILLA VACACIONES INVERSION 2013	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO	-	-	-
15	OTROS	PROGRAMADO	-	-	-
		EJECUTADO			-
	TOTAL	PROGRAMADO			3,540.70
		EJECUTADO			4,001.42

RESPONSABLE: LIC. ARQ. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

	Ministerio de Cultura Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.
AVANCE FISICO PORCENTUAL - 2014 AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BINES MUEBLES E INMUEBLES OBRA: PIA:PMA "RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO" COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105 RESPONSABLE: ARQLGA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI	

MESES	REFERENCIA ANUAL		REFERENCIA TOTAL		ACUMULADO TOTAL	O.B.S
	MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL		
ACUMULADO ANTERIOR %					9.97	
ENERO	PROGRAMADO	4.09	4.09	3.51	13.48	
	EJECUTADO	3.80	3.80	3.26	3.26	
FEBREERO	PROGRAMADO	4.09	8.17	3.51	16.99	
	EJECUTADO	4.09	7.89	3.51	6.77	
MARZO	PROGRAMADO	4.09	12.26	3.51	20.50	
	EJECUTADO	4.09	11.97	3.51	10.28	
ABRIL	PROGRAMADO	11.56	23.81	9.92	30.42	
	EJECUTADO	9.89	21.86	8.49	18.78	
MAYO	PROGRAMADO	11.56	35.37	9.92	40.35	
	EJECUTADO	13.50	35.36	11.59	30.37	
JUNIO	PROGRAMADO	11.56	46.93	9.92	50.27	
	EJECUTADO	12.93	48.29	11.11	41.48	
JULIO	PROGRAMADO	12.52	59.44	10.75	61.02	
	EJECUTADO	17.04	65.33	14.64	56.11	
AGOSTO	PROGRAMADO	9.93	69.37	8.52	69.55	
	EJECUTADO	10.66	76.00	9.16	65.27	
SETIEMBRE	PROGRAMADO	11.56	80.92	9.92	79.47	
	EJECUTADO	8.16	84.15	7.01	72.28	
OCTUBRE	PROGRAMADO	6.86	87.79	5.90	85.37	
	EJECUTADO	6.80	90.96	5.84	78.12	
NOVIEMBRE	PROGRAMADO	4.09	91.88	3.51	88.88	
	EJECUTADO	4.09	95.04	3.51	81.63	
DIEMBRE	PROGRAMADO	8.12	100.00	6.98	95.86	
	EJECUTADO	4.57	99.61	3.93	85.55	
TOTAL	PROGRAMADO	100.00	100.00	85.89	95.86	
	EJECUTADO	99.61	99.61	85.55	85.55	

Meta fisica global 70.00
 Meta programada anual 60.12
 Porcentaje Acumulado 2103 9.97
 Presupuesto del año 123,819.00 S/.
 Presupuesto total 144,166.24 S/.

	Ministerio de Cultura Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.
AVANCE FISICO EN METRADOS - 2014 AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BINES MUEBLES E INMUEBLES OBRA: PIA:PMA "RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO." COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA META 0105 RESPONSABLE: ARQLGA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI	

MESES	REFERENCIA ANUAL		REFERENCIA TOTAL		ACUMULADO TOTAL	O.B.S
	MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL		
ACUMULADO ANTERIOR %					6.98	
ENERO	PROGRAMADO	2.46	2.46	2.46	9.44	INICIO DE OBR
	EJECUTADO	2.28	2.28	2.28	2.28	
FEBRERO	PROGRAMADO	2.46	4.91	2.46	11.89	
	EJECUTADO	2.46	4.74	2.46	4.74	
MARZO	PROGRAMADO	2.46	7.37	2.46	14.35	
	EJECUTADO	2.46	7.20	2.46	7.20	
ABRIL	PROGRAMADO	6.95	14.32	6.95	21.30	
	EJECUTADO	5.95	13.14	5.95	13.14	
MAYO	PROGRAMADO	6.95	21.26	6.95	28.24	
	EJECUTADO	8.12	21.26	8.12	21.26	
JUNIO	PROGRAMADO	6.95	28.21	6.95	35.19	
	EJECUTADO	7.77	29.03	7.77	29.03	
JULIO	PROGRAMADO	7.53	35.74	7.53	42.72	
	EJECUTADO	10.25	39.28	10.25	39.28	
AGOSTO	PROGRAMADO	5.97	41.70	5.97	48.68	
	EJECUTADO	6.41	45.69	6.41	45.69	
SETIEMBRE	PROGRAMADO	6.95	48.65	6.95	55.63	
	EJECUTADO	4.90	50.59	4.90	50.59	
OCTUBRE	PROGRAMADO	4.13	52.78	4.13	59.76	
	EJECUTADO	4.09	54.68	4.09	54.68	
NOVIEMBRE	PROGRAMADO	2.46	55.24	2.46	62.22	
	EJECUTADO	2.46	57.14	2.46	57.14	
DIEMBRE	PROGRAMADO	4.88	60.12	4.88	67.10	
	EJECUTADO	2.75	59.89	2.75	59.89	
TOTAL	PROGRAMADO	60.12	60.12	60.12	67.10	
	EJECUTADO	59.89	59.89	59.89	66.87	

Presupuesto del año 123,819.00 S/.
 Presupuesto total 144,166.24 S/.
 Volumen intervenido 6.98
 Volumen por intervenir el 2014 63.02 m3
 Saldo por intervenir 0.00 m3
 Meta total 70.00

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

13.00 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO: DE INTERVENCION:
TRINCHERA 10, SECTOR "B" MURO DEL TESTERO.**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO: DE INTERVENCION:
TRINCHERA 09, SECTOR "B" MURO DEL TESTERO.**



Vista de la capa IV

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO: DE INTERVENCION:
UNIDAD DE EXCAVACION N°. 15, SECTOR "B" MURO DE LA EPISTOLA**



**INTERVENCION: Proceso de Trabajos
UNIDAD DE EXCAVACION N°. 02, SECTOR "A" MURO DEL EVANGELIO.**



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavacion No. 03, Sector "A" muro de la Epístola.



Proceso de Trabajos: Unidad de Excavacion No.05, muro de la Espistola Sector "A". (por la Balaustrada).



Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavacion No. 09, Sector "B" muro del Evangelio.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavacion No. 10, Sector "B" muro del Evangelio.



Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavación No. 11, Sector "B" muro del Evangelio.




Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavacion No. 12, Sector "B" muro de la Epistola.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: trazo y niveles de la unidad de excavación TRINCHERA N0. 03, sector "A" muro del Evangelio.

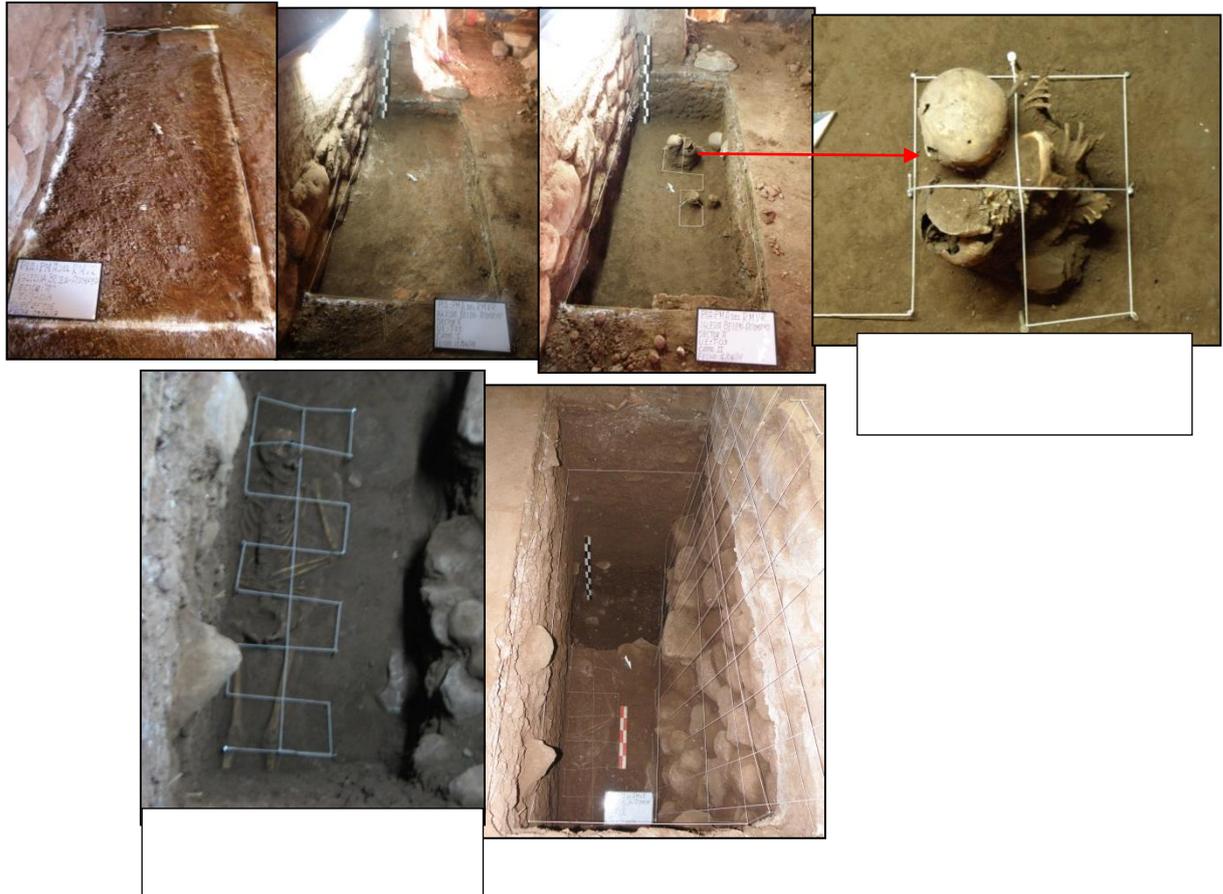

Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavación T- No. 05 Sector "A" muro de la Epístola.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavación No.13, muro de la Epístola Sector "B".



Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavación T - No. 14, Sector "B" muro del Evangelio.



Proceso de Trabajos: de la unidad de excavación TRINCHERA N°. 02, sector "A" muro del Evangelio.



RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCA

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavación No. 04, Sector “A” sub sector Nave.




Proceso de Trabajos: Unidad de Excavación ; No.06, muro de la torre del Campanario Sector “B”.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: de la unidad de Excavación: No.07, Sector "B" muro del Evangelio y muro de la torre del campanario.

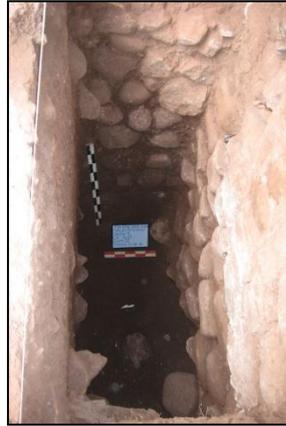

Proceso de Trabajos: Unidad de Excavación ; T- No.08, muro de la torre del Campanario Sector "B".



Zarpa en la torre del campanario.

Proceso de Trabajos: Unidad de Excavación; UE - No.13, muro de la Epístola Sector "B".



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Evidencia de entierro contemporaneo

Proceso de Trabajos: unidad de excavación TRINCHERA N0. 01, sector "A" muro del Evangelio.



Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavación T- No. 02, Sector "A" muro del Evangelio.




Proceso de excavación.




EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: Unidad de Excavación ; Trincherera No.07, muro de la Epístola Sector "A".

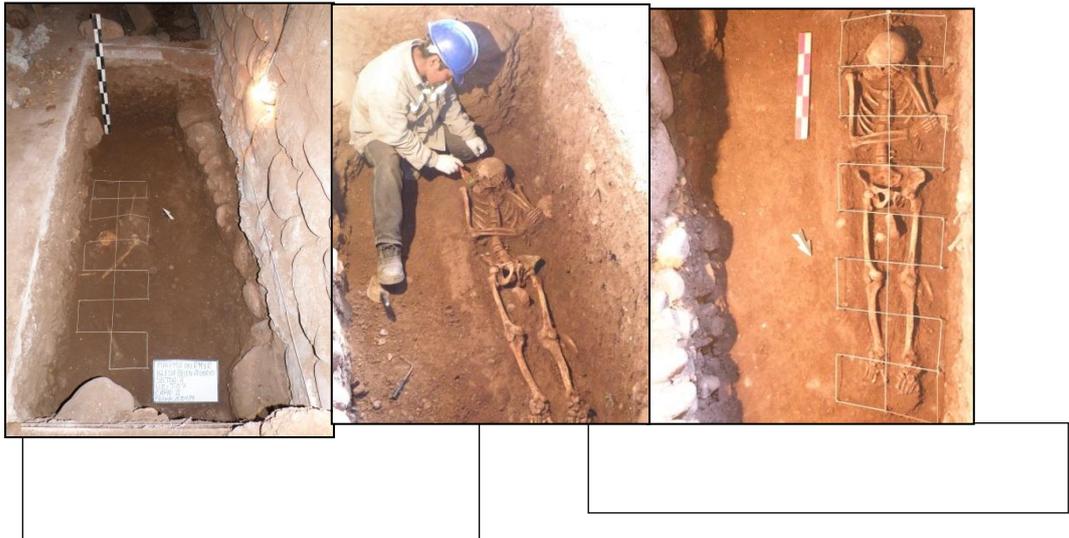

Proceso de Trabajos: de la unidad de Excavación: No.08, Sector "B" muro del Evangelio.

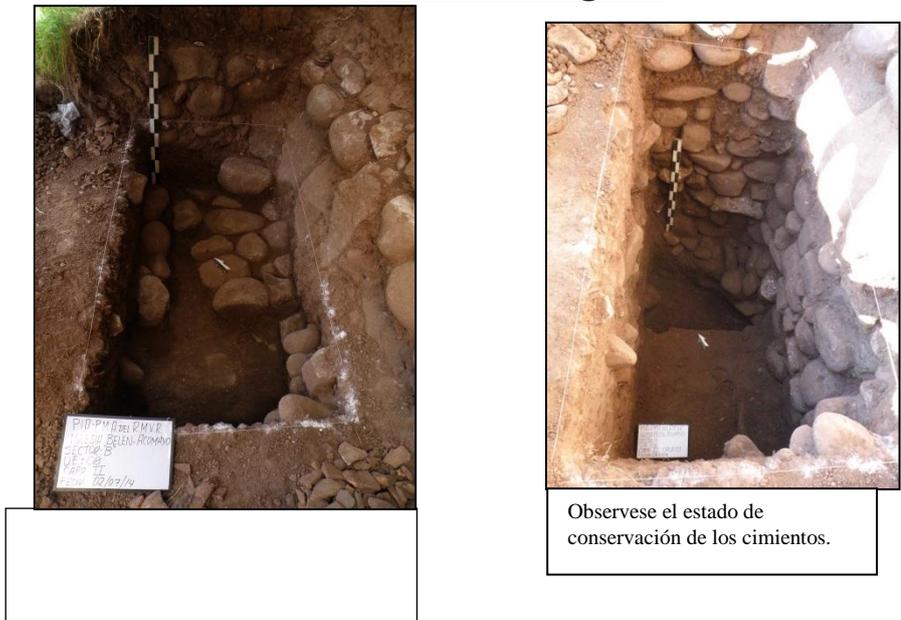

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: de la unidad de excavación TRINCHERA N0. 04, sector "A"
SECTOR DE LA NAVE



Proceso de Trabajos: de la Unidad de Excavación No. 01, Sector "B"
MURO DE PIES.



Proceso de Trabajos: nivelación y apisonado de los cuadros de Excavación.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.



Proceso de Trabajos: relleno con material propio, de los cuadros de Excavación.



Proceso de Trabajos: Registro arqueológico




EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.


Proceso de Trabajos: de eliminación de material excedente



Proceso de trabajos: Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción



Exploración de cimiento

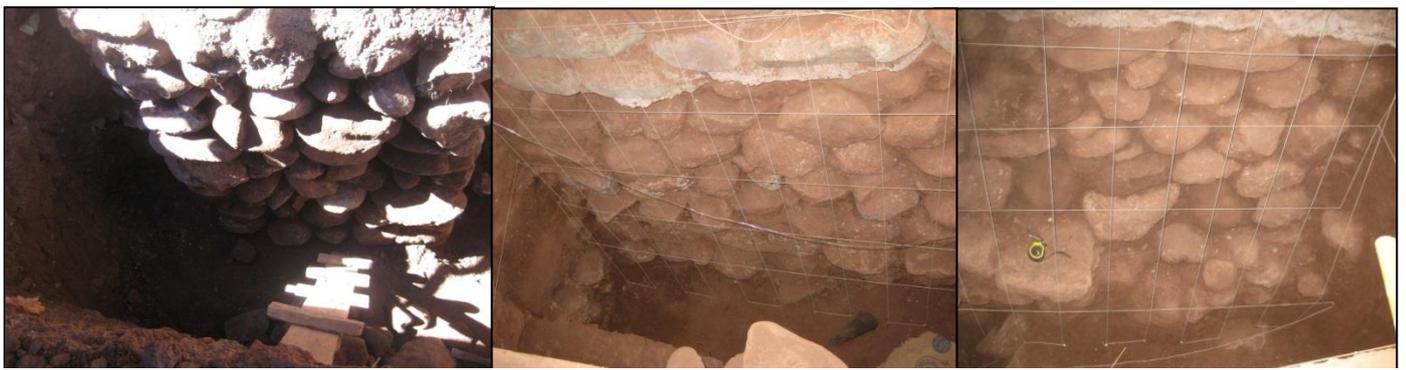

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Observese el estado de conservación de los cimientos. Donde los elementos líticos están exfoliados.




Cimientos en pésimo estado de conservación debido a la humedad que presenta el terreno debido a factores naturales.

Registro Fotografico Del Área Monitoreada



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.



REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE AREA MONITOREADA

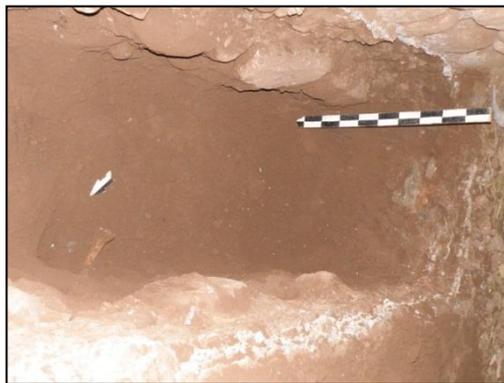

Proceso de Trabajos: nivelación y apisonado de los cuadros de Excavacion.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.



Proceso de Trabajos: lavado de material cultural.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: traslado de agua para el apisonado de los cuadros de excavación de la Unidades de Excavación.



Proceso de Trabajos: Nivelacion y apisonado de los cuadros de excavación .



AL CULTURAL.

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: CLASIFICACION DE MATERIAL CULTURAL



PIA: PMA, RMVR, IGLESIA BELEN
SECTOR: IGLESIA BELEN
SECTOR: A
UE: 04
CAPA: III
MATERIAL: Textil - Metal
FECHA: 25-09-14 / 24-01-14
OBSERVACIONES: 2 de Muebles
DINERO DE ENTREGA:



PIA: PMA, RMVR, IGLESIA BELEN
SECTOR: IGLESIA BELEN
SECTOR: A
UE: 03
CAPA: III
MATERIAL: Textil
FECHA: 25-09-14 / 24-01-14
OBSERVACIONES: Fragmento de tela.

PIA: PMA, RMVR, IGLESIA BELEN
SECTOR: IGLESIA BELEN
SECTOR: A
UE: 04
CAPA: I
MATERIAL: Frag. Cerámica
FECHA: 25-09-14
OBSERVACIONES: Pesa: 0.250g



PIA: PMA, RMVR, IGLESIA BELEN-ACOMAYO
SECTOR: A
UE: T-2
CAPA: III
FECHA: 25-09-14

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
Área de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles
IO Nº

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Proceso de Trabajos: ESTUDIO E INTERPRETACION DE MATERIAL CULTURAL.





EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

12.00 EJECUCION DE PROGRAMACION GENERAL DE OBRA REFERIDA A LA PROGRAMACION APROBADA.



**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE
ACOMAYO.**

**13.00 INFORME PRELIMINAR DEL COMPONENTE DE
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA.**



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

REGISTRO FOTOGRAFICO.



**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE
ACOMAYO.**

OTROS DOCUMENTOS.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

SALDO DE EXISTENCIA FISICA DE MATERIALES VALORIZADOS.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

VALORIZACIONES MENSUALES DEL AÑO.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

EXTRACTOS MENSUALES DE LAS PARTES DE ALMACEN DEL AÑO.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. AÑO 2014.

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

	Ministerio de Cultura	Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco	Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural
MINISTERIO DE CULTURA			
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO			
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles			
FOLIO Nº			



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

PLANOS DE OBRA



**EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE
ACOMAYO.**

16. OTROS DOCUMENTOS

- Cuaderno de Obra
- Cuaderno de Control de Asistencia
- Álbum fotográfico.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

PARTES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OBRA MENSUALES AÑO 2014

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

	Ministerio de Cultura	Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco	Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural
MINISTERIO DE CULTURA			
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO			
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles			
FOLIO Nº			



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2014

REPORTES DE PECOSAS AFECTADOS A LA

RESPONSABLE: LIC. ARQLA. NILDA CCANCHI ATAYUPANQUI.

	Ministerio de Cultura	Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco	Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural	Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.
MINISTERIO DE CULTURA				
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO				
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles				
FOLIO Nº				



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

Meta. 0105



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE
ACOMAYO.

**RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA**



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

DICTAMEN DE RESOLUCION DE APROBACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

ACTA DE INICIO DE OBRA



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

ACTA DE CIERRE DE OBRA



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

ACTA DE SUPERVISION DE OBRA

EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

PECOSAS COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN SECUNDARIO



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE ALMACEN



EXPEDIENTE DE PRE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICO IGLESIA BELEN DE ACOMAYO.

**EJECUCION DE PROGRAMACION GENERAL DE OBRA,
REFERIDA A LA PROGRAMACION APROBADA**
